

PROAmazônia

Programa Integral Amazónico de
Conservación de Bosques y Producción Sostenible



GREEN
CLIMATE
FUND



MINISTERIO DEL AMBIENTE Y AGUA
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Lenin



Comité Directivo

Hitos 2020 y Planificación Operativa Anual 2021 PROAmazonía



18 de enero 2021

Orden del día



Al servicio
de las personas
y las naciones



TEMA	RESPONSABLE	TIEMPO
Presentación y aprobación del informe anual de gestión 2020 (hitos principales)	Gerente de PROAmazonía	30 minutos
Presentación y aprobación de las estrategias de intervención y el POA 2021 validado por el Comité de Gestión (proyectos GCF, GEF, y PPR)	Gerente de PROAmazonía	40 minutos
Aprobación de las enmiendas a los Convenios con FAO y ONU Mujeres	Coordinadora C3 Coordinador C4	10 minutos
DSA con tarifa PNUD (viáticos de misiones)	Coordinadora de A&E de PNUD	5 minutos
Informar sobre la enmienda entre GCF y PNUD (metas finales vigentes)	Coordinadora de A&E de PNUD	5 minutos
Varios	Miembros del Comité Directivo	30 minutos

Comité Directivo

Presentación y aprobación del
informe anual de gestión 2020



AVANCES DE PROAMAZONÍA – (Periodo 2017- 2020)

51%


- **Avance programático o de gestión:**
51% cumplido de las metas planificadas para PROAmazonía hasta el momento (vigencia del programa: 2017 - 2023).



50%

- **Avance financiero:**
48% de la planificación de actividades ejecutadas por PROAmazonía para el cumplimiento de los proyectos del GCF y GEF.

Avance global del programa

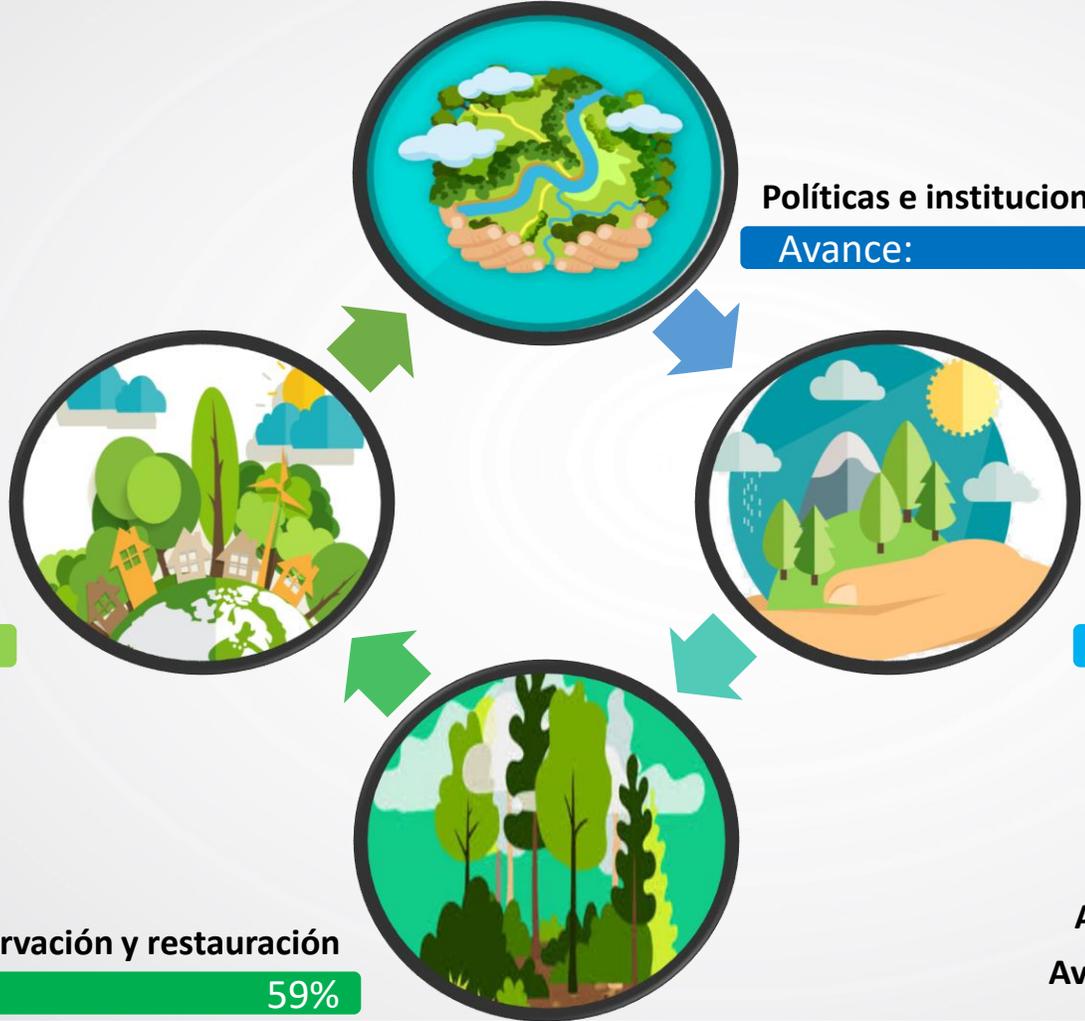

Políticas e institucionalidad
Avance: 69%

Producción sostenible
Avance: 38%

Conservación y restauración
Avance: 59%

Financiamiento y REDD+
Avance: 39%

Avance programático: 51%
Avance presupuestario: 50%

Hitos 2020

01 POLÍTICAS E INSTITUCIONALIDAD



28 PDOT actualizados con criterios de cambio climático, producción sostenible y REDD+



1 Programa de capacitación dirigido a 85 líderes de comunidades
(30% mujeres y 70% hombres)



4 Planes de vida construidos y aprobados por las comunidades




118 propuestas de proyectos de inversión sobre conservación de bosques y cambio climático



17 Propuestas de PUGS cantonales elaboradas



93 propuestas de ordenanzas cantonales y provinciales y 25 resoluciones parroquiales elaboradas

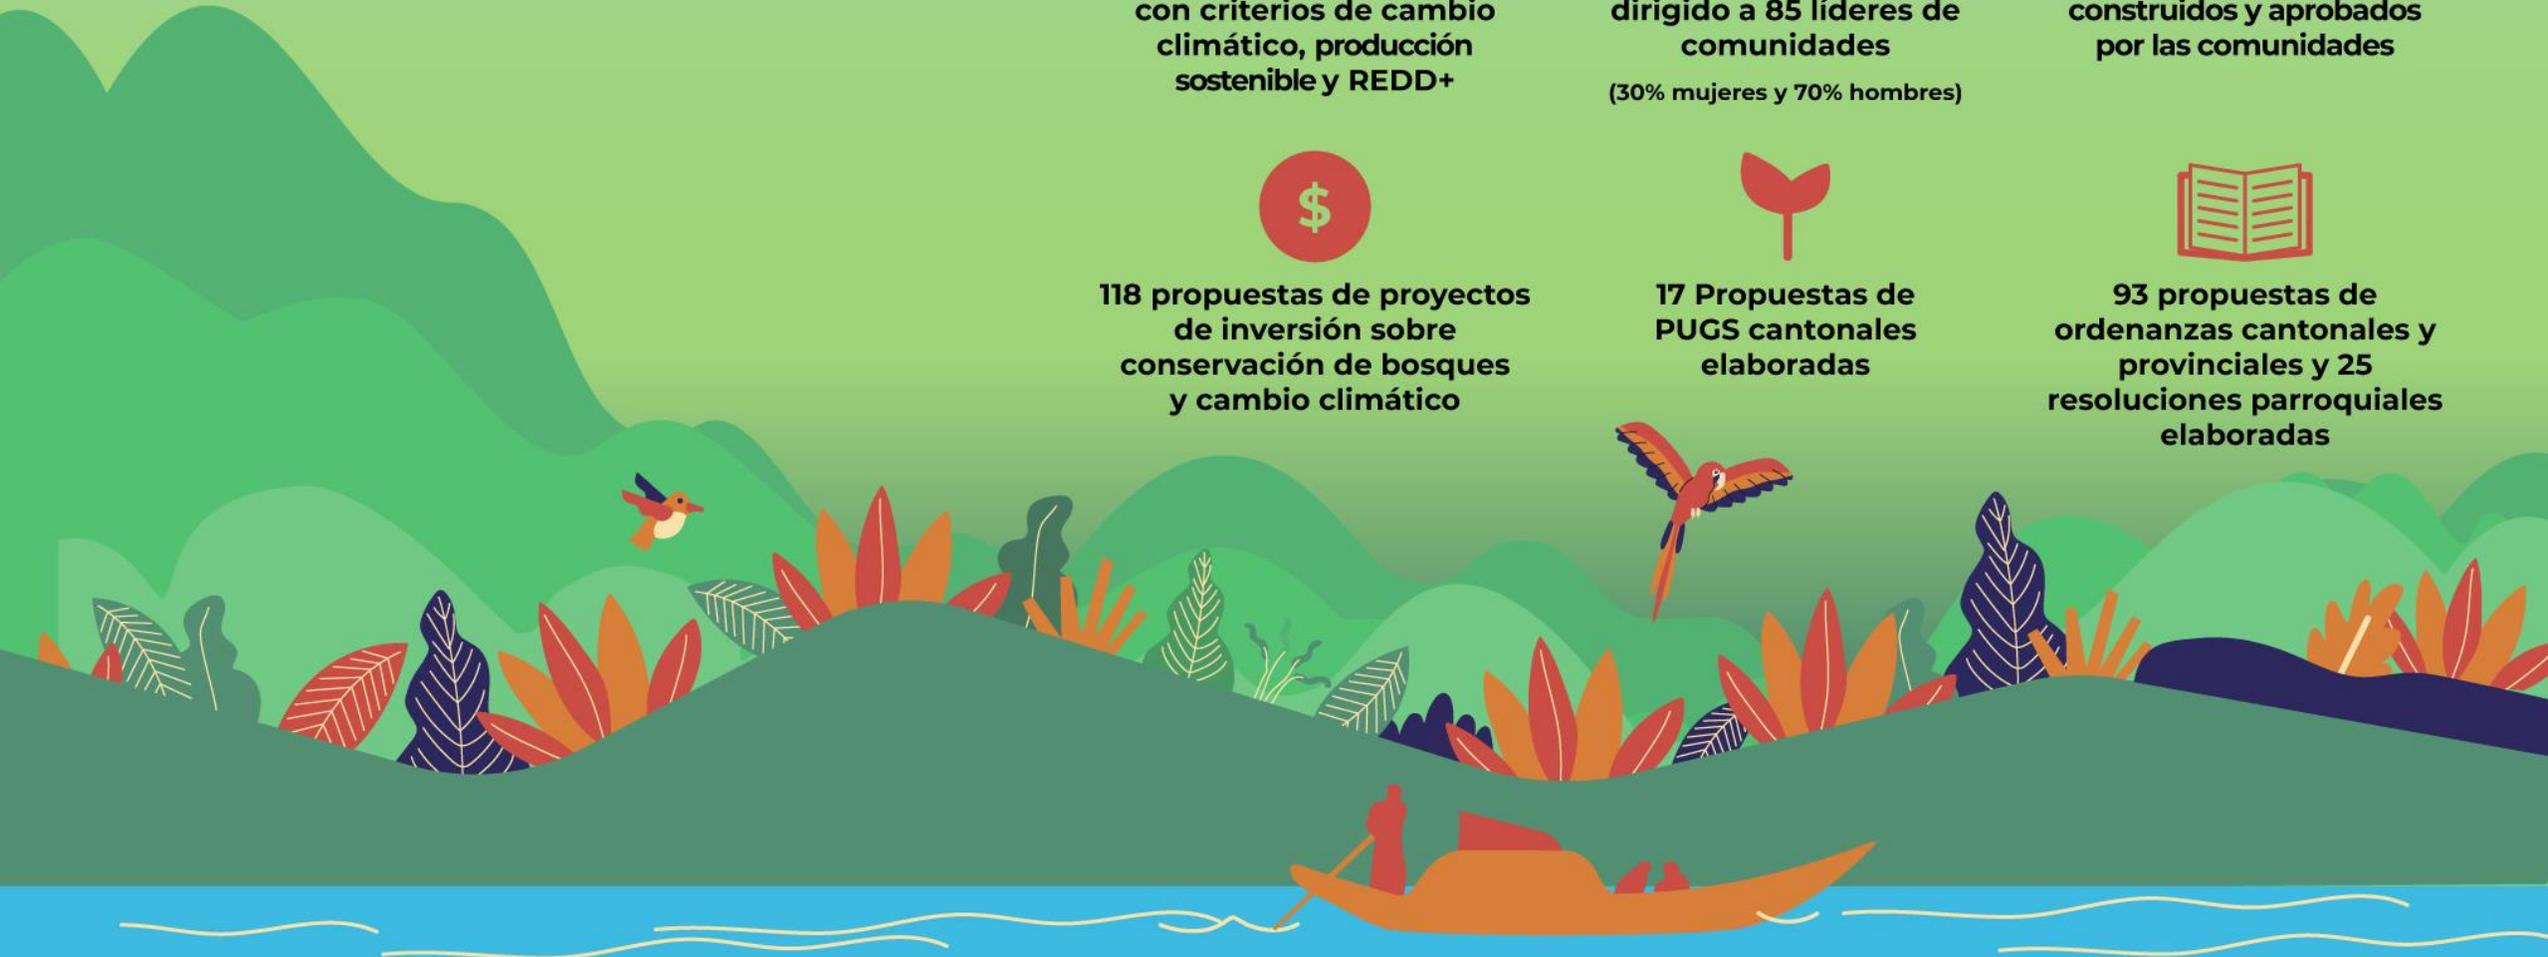

02

TRANSICIÓN A UNA PRODUCCIÓN SOSTENIBLE Y LIBRE DE DEFORESTACIÓN

Productores de las cadenas de café, cacao, ganadería y palma aceitera



2.470 Productores capacitados en Producción Sostenible



2.500 productores beneficiados con la metodología "Creciendo con su Negocio"



Arranque de escuelas de campo para capacitar a más de 7.000 productores



15.066 ha en transición hacia sistemas de producción agropecuaria sostenibles (GCF)



17.000 ha han incorporado prácticas agropecuarias amigables con el ambiente (GEF)



1 Plan de acción regional para la implementación de la cadena de valor sostenible de palma aceitera



38 organizaciones recibieron kits de bioseguridad. Más de 3.000 beneficiarios



1 Producto con certificación libre de deforestación: Certificación RSPO - Palma



1.210 fincas de palma aceitera y 370 fincas de café y cacao mapeadas para la implementación de un sistema de monitoreo de la deforestación



Elaboración de guía dirigida a equipos técnicos para la incorporación del enfoque de género en procesos asociativos de productores



03 MANEJO FORESTAL SOSTENIBLE, CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN



11.023 ha en proceso de restauración



393.372 ha bajo protección y acciones REDD+ con visión de cuenca hidrográfica



6 puestos fijos de control forestal repotenciados



14 prototipos de PFM (productos forestales no maderables) desarrollados con el apoyo de la UTPL



Red Nacional de Conocimientos sobre productos forestales no maderables conformada por 30 investigadores



Mesa redonda regional de productos forestales no maderables conformada y operativa



140 funcionarios capacitados en dendrología y anatomía de la madera
(27% mujeres y 73% hombres)



38 conglomerados de la II Evaluación Nacional Forestal levantados en las provincias de Morona Santiago, Napo y Pastaza



3 aplicativos móviles diseñados para la automatización del levantamiento de información en campo



4.573 beneficiarios de comunidades indígenas de 17 proyectos de bioemprendimientos



159.557 ha bajo conservación con el Proyecto Socio Bosque





1.559 personas capacitadas (43% mujeres) en áreas de planificación, sistemas información local, dendrología, control forestal, REDD+, salvaguardas, género



Fortalecimiento del Sistema Nacional de Monitoreo de Bosques: implementación de hardware para 5 provincias



Acompañamiento y diseño de 3 Planes de Implementación de medidas y acciones REDD+ (GAD Pastaza, CONFENIAE y San Pablo del Lago)

SIS

Intercambio internacional de experiencias sobre SIS, con la participación de representantes de Chile, Costa Rica, México, Paraguay y Ecuador

REDD+
ECUADOR

Reconformación de la mesa REDD+ (45 organizaciones)



Elaboración de 4 cartillas de capacitación sobre REDD+ interpretadas al Kichwa y Shuar



Actualización del Estudio diagnóstico sobre la situación de las mujeres amazónicas – documento entregado a la Secretaría de Derechos Humanos



Desarrollo y presentación a la Convención Marco de las Naciones Unidas (CMNUCC) del nivel de Referencia de las Emisiones Forestales causadas por la Deforestación



Capacitación a 54 técnicos de PROAmazonía, MAG y MAAE – Programa de capacitación de género y derechos de las mujeres



Organización de Seminario Internacional de Degradación Forestal, (400 participantes) de Brasil, Ecuador, Costa Rica, México, Honduras




PROYECTO PAGO POR RESULTADOS REDD+ ECUADOR

Ecuador recibió un fondo no reembolsable de 18.5 millones de dólares por la reducción de la deforestación evitada durante el año 2014.

Este será implementado por PROAmazonía en acciones que contribuirán a la conservación de bosques y la restauración de áreas deforestadas y degradadas.



Avances 2020 del programa

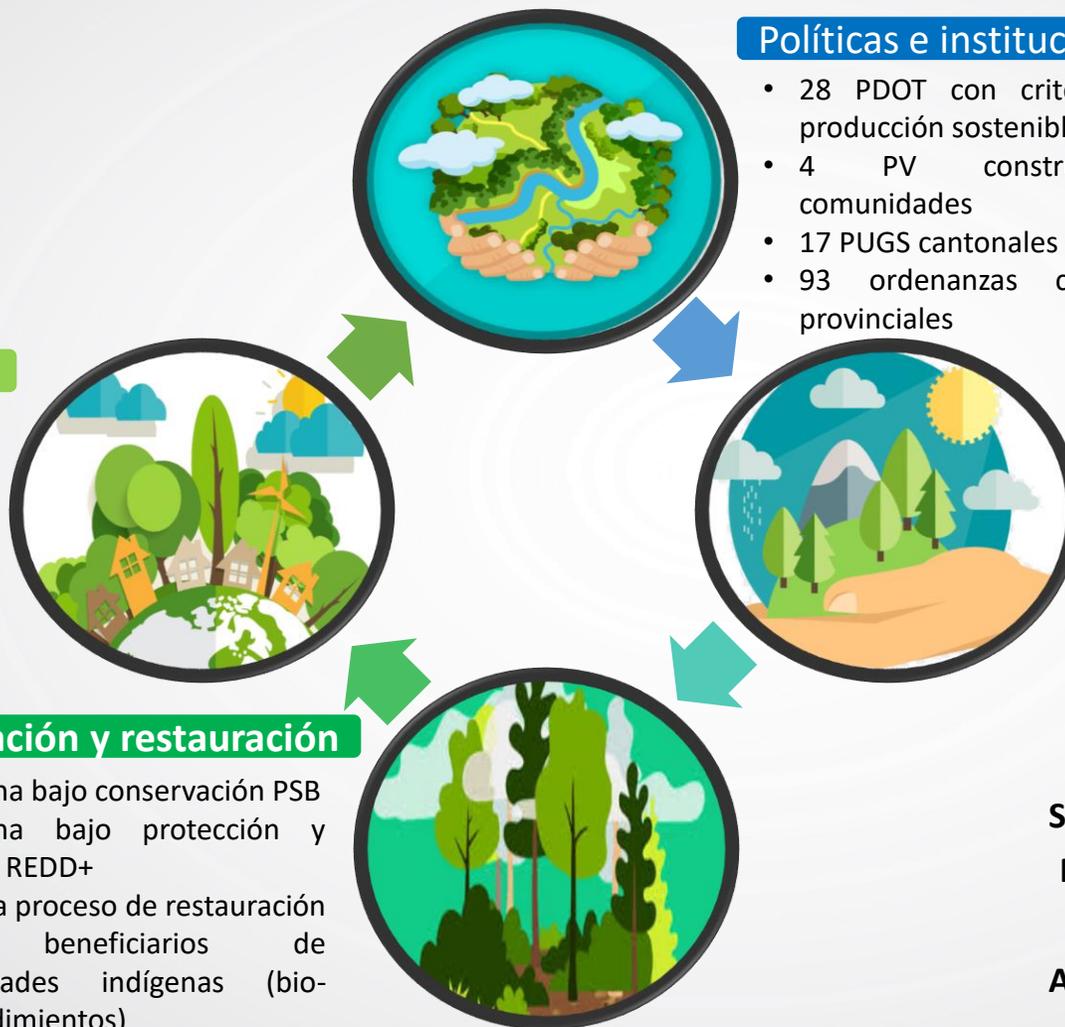

Políticas e institucionalidad

- 28 PDOT con criterios de CC, producción sostenible y REDD+
- 4 PV construidos con comunidades
- 17 PUGS cantonales
- 93 ordenanzas cantonales y provinciales

Producción sostenible

- 2.470 productores capacitados
- 15.066ha en transición a sistemas de producción sostenible
- 17.000ha incorporan prácticas amigables con el ambiente
- Certificación RSPO – palma aceitera

Financiamiento y REDD+

- 1.559 personas capacitadas (43% mujeres)
- Fortalecimiento SNMB
- Nivel de referencia de emisiones forestales por deforestación
- Seminario internacional de degradación forestal (400 participantes)

Conservación y restauración

- 159.557ha bajo conservación PSB
- 393.372ha bajo protección y acciones REDD+
- 11.023ha proceso de restauración
- 4.573 beneficiarios de comunidades indígenas (bio-emprendimientos)

Superficie influenciada: 580.952 hectáreas

Personas beneficiadas: 8.602 personas

Avance programático: 81,50%

Avance presupuestario: 91,15%

Ejecución presupuestaria 2020



Al servicio
de las personas
vulnerables



GREEN
CLIMATE
FUND



gef

Presupuesto total: \$11.796.464,32




Institución Donante



\$ 8.487.615,64

Ejecución Presupuestal
al 31 de diciembre de 2020




■ Ejecución ■ Saldo

Institución Donante



\$ 2.801.178,70

Ejecución Presupuestal
al 31 de diciembre de 2020




■ Ejecución ■ Saldo

Institución Donante



\$ 507.669,98

Ejecución Presupuestal
al 31 de diciembre de 2020



■ Ejecución ■ Saldo

Memorias fotográficas 2020



Al servicio
de las personas
y las naciones



MINISTERIO DEL AMBIENTE Y AGUA
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA




Comité Directivo

Presentación y aprobación de las estrategias de intervención y el POA 2021 validado por el Comité de Gestión (proyectos GCF, GEF, y PPR)



Planificación operativa anual 2021

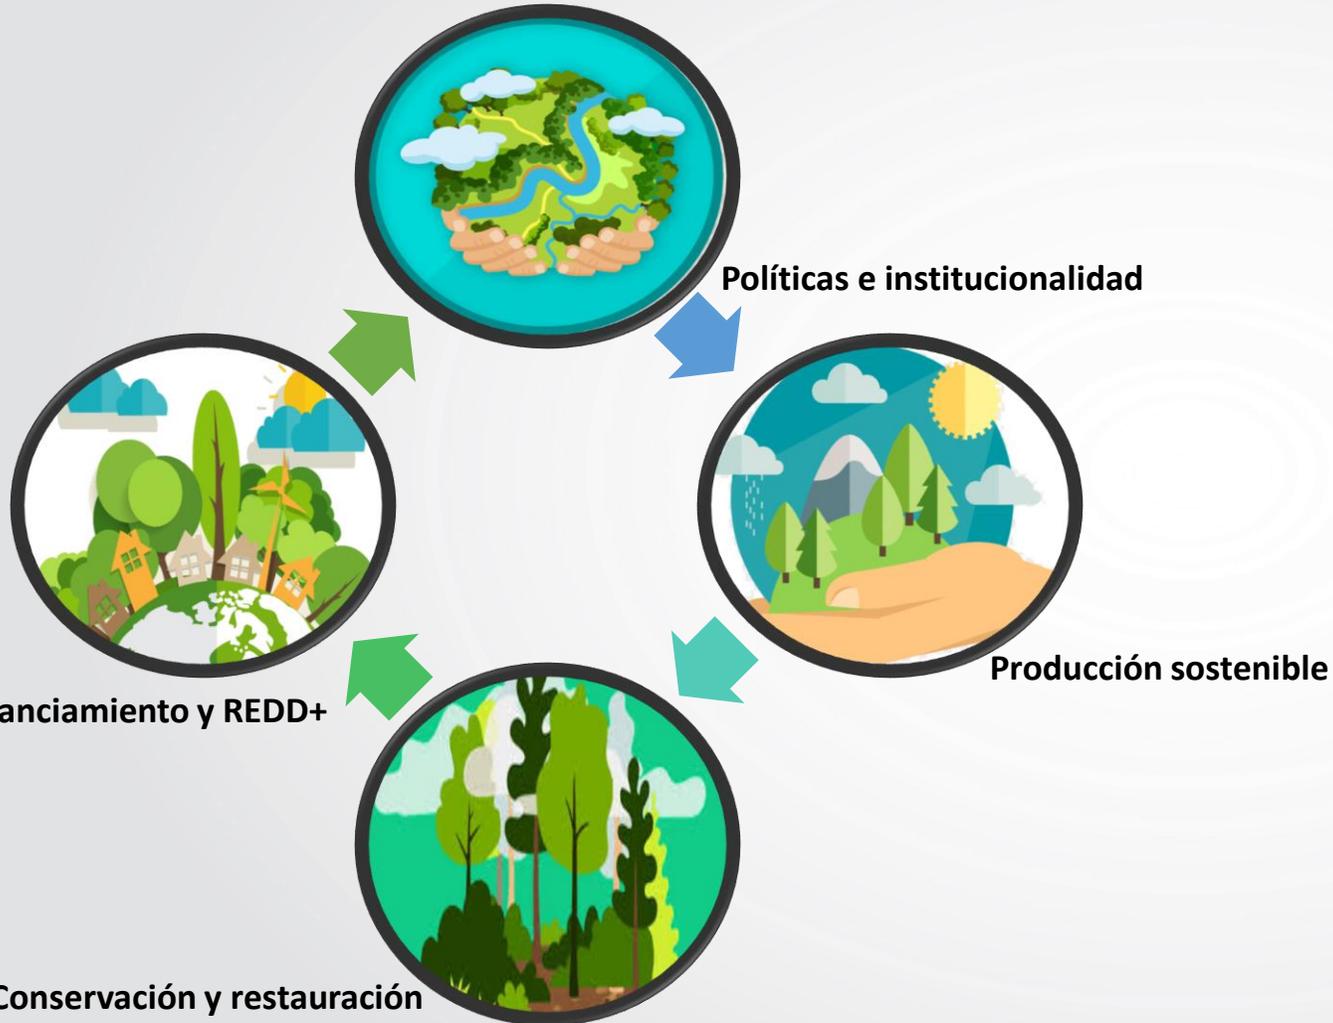


Políticas e institucionalidad




Producción sostenible



Al servicio
de las personas
y las naciones

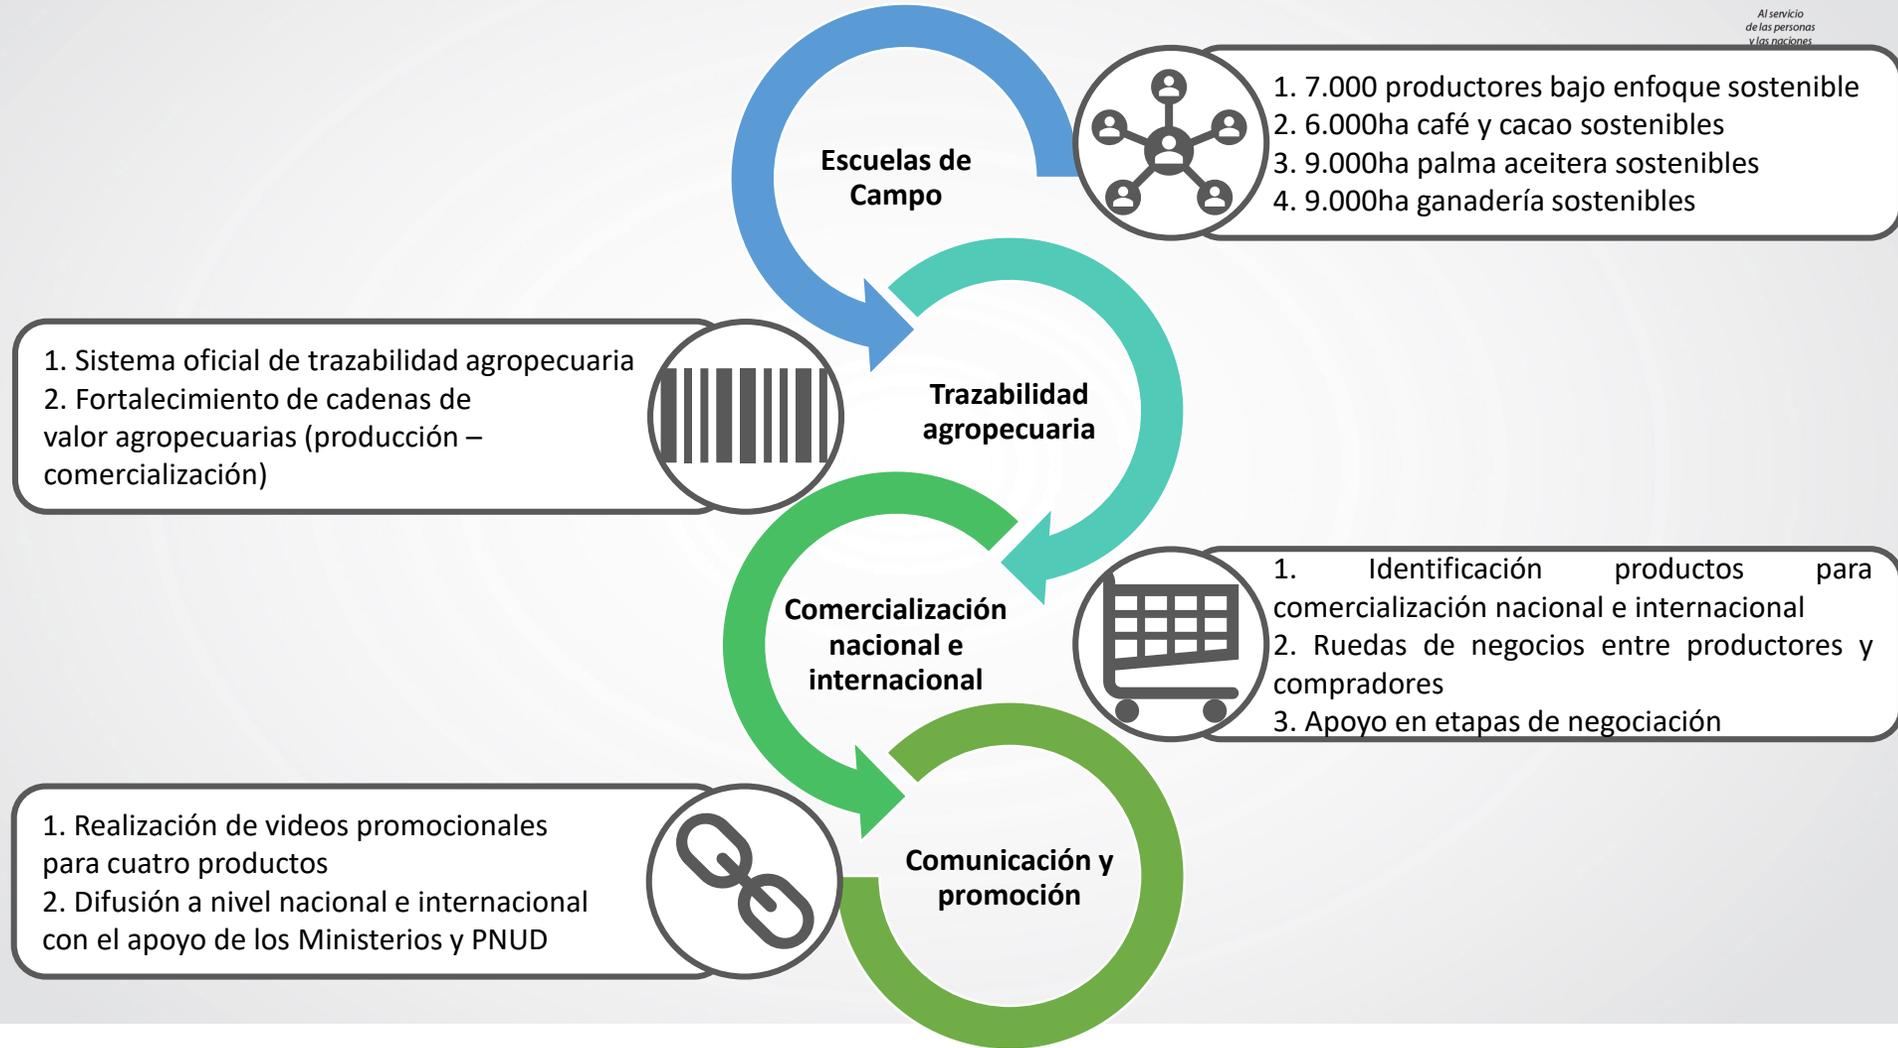


Conservación y restauración

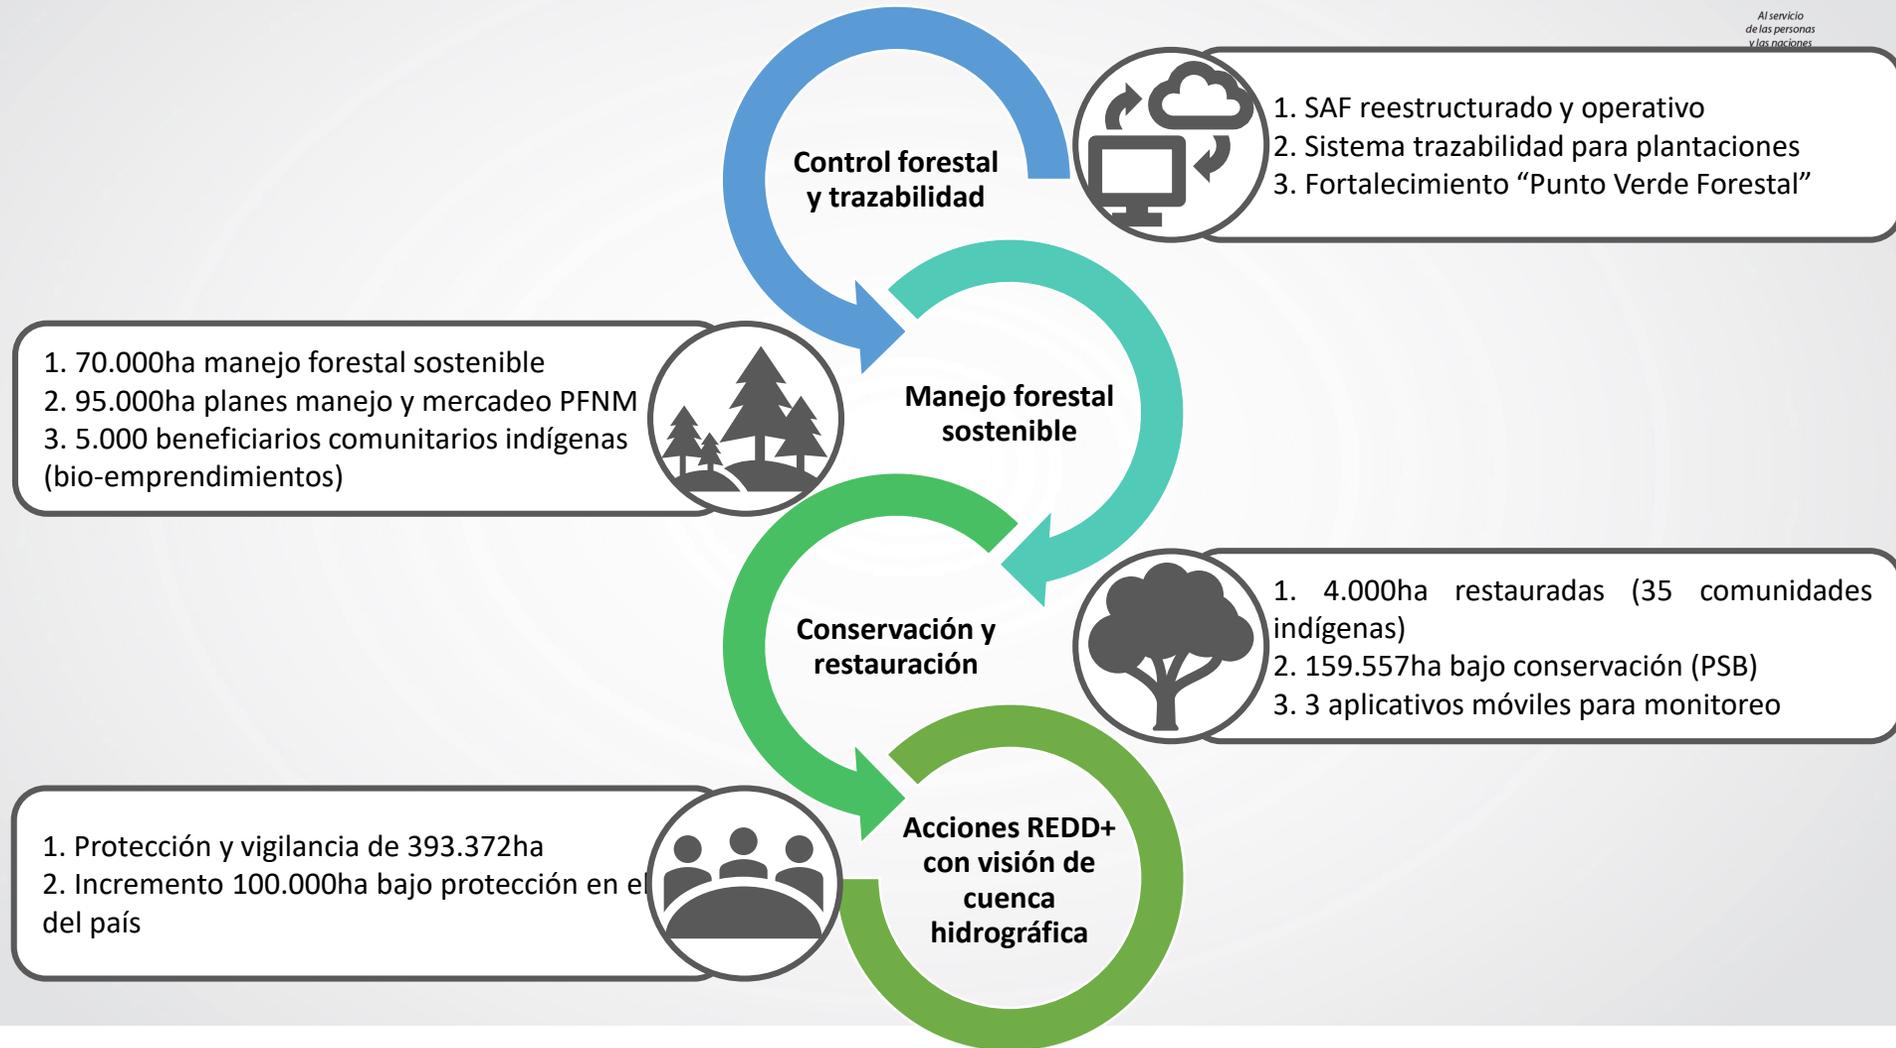

Financiamiento y REDD+



Al servicio
de las personas
y las naciones

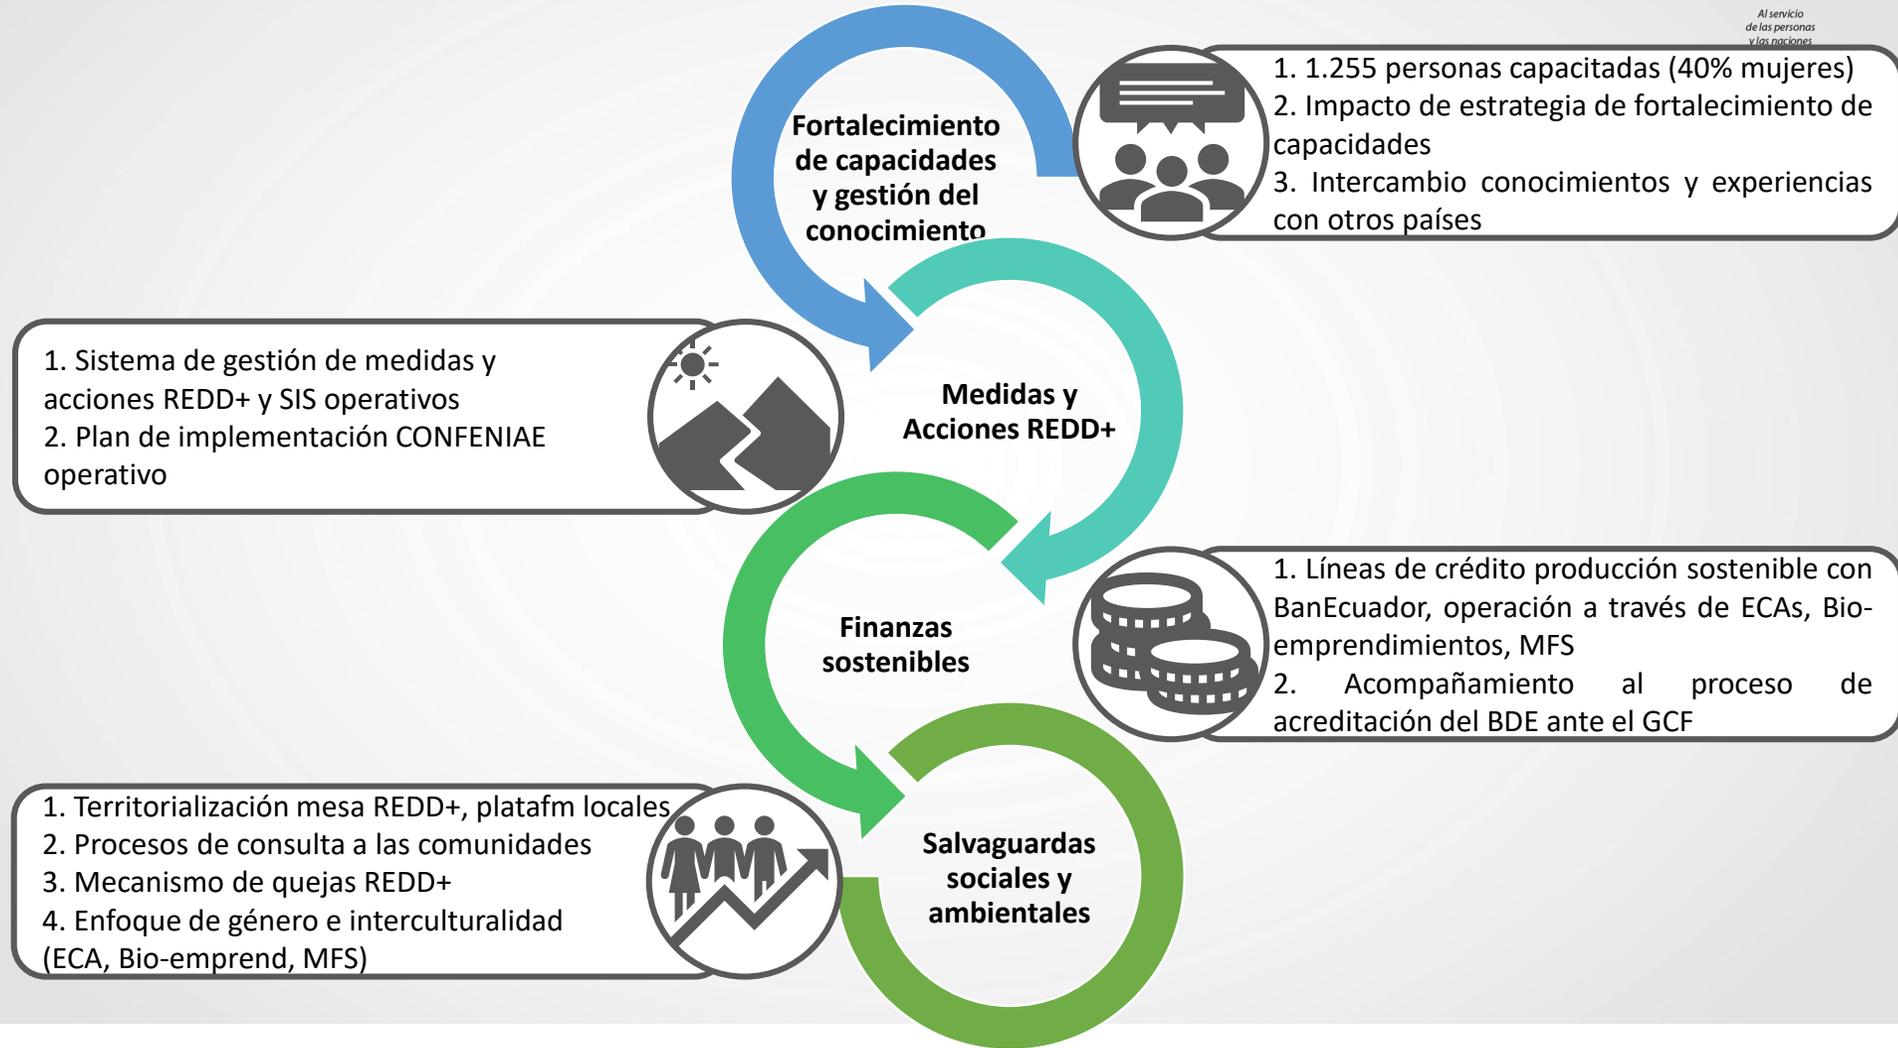



Presupuesto total: \$16.530.806,68



Institución Donante



9,4M

1,1M 3,4M 3,3M 985K 530K

C1 C2 C3 C4 PMC

Institución Donante



2,8M

832K 1,13M 812K 64K 23K

C1 C2 C3 C4 PMC

Institución Donante



4,2 M

1.0M 49,4K 1,2M 1,6M 209K

C1 C2 C3 C4 PMC

Comité Directivo

Aprobación de las enmiendas a los convenios con FAO y
ONU Mujeres



Enmienda convenio FAO



Al servicio
de las personas
y las naciones



1. Elaboración de 2 Planes de Manejo Integral (Comunidades paisaje sur GEF)

- USD. 122.599,95

2. Implementación de 1 plan de manejo integral (Comunidades paisaje sur GEF)

- USD. 169.790,00

3. Elaboración del Plan de Manejo de Bosque Protector Alto Nangaritza (GEF)

- USD. 83.900,00

4. Gobernanza forestal: apoyo en la implementación de Punto Verde Forestal y articulación con el sistema de trazabilidad (GCF)

- USD. 83.600,00

5. Desarrollo de mejoras al SINGEI

- USD. 18.600,00

Costos de implementación

- USD. 68.131,69

Enmienda convenio ONU Mujeres



Al servicio
de las personas
y las naciones



Principales puntos de la Adenda del Convenio –ONU Mujeres – PROAmazonía

** No modifica el alcance del convenio ni presupuesto*



Comité Directivo

Enmienda Funded Activity Agreement (FAA)



Mónica Andrea
Coordinador del Área de Ambiente y Energía (PNUD)

Generalidades



- El FAA es el instrumento oficial vinculante que firma el PNUD con el Fondo Verde del Clima (GCF) para la implementación de proyectos.
- Contiene todas las cláusulas legales vinculadas con temas administrativos, técnicos y financiero/presupuestario.
- Para el caso de ProAmazonía (porción GCF), el FAA se hizo efectivo el 22 de mayo de 2017:
 - Este FAA contempla el marco de resultados y metas de impacto y de resultados de los cuatro componentes del Programa PROAmazonía.

Ajustes



- Con la Evaluación de Medio Término se solicitó ante el donante la necesidad de cambiar dos metas vinculadas con las emisiones de GEI.
- El mecanismo para oficializar este cambio (considerado menor) fue la elaboración de una enmienda al FAA con los siguientes y únicos ajustes (19 de octubre 2020).

Reducción de emisiones (acumulativo)		USD promedio por tCO2	
Meta FAA original	Meta FAA de la enmienda	Meta FAA original	Meta FAA de la enmienda
Reducción de 15 millones tCO2eq (2016-2020)	Reducción de 13.36 millones tCO2eq (2017-2021)	5,53	6,29
<p>Cambio realizado para que la reducción esté acorde con:</p> <ul style="list-style-type: none"> - La fecha de inicio de implementación del proyecto (2017). - El cálculo de reducción de emisiones realizado por el Gobierno del Ecuador utilizado para el Nivel de Referencia de Emisiones Forestales 2000-2008 (FREL 1) que son reportados a nivel nacional. - Cálculo de la meta con base en los contenidos de carbono de los diferentes tipos de bosque, que se obtuvieron en la Evaluación Nacional Forestal, afinando la meta con datos reales que no fueron considerados inicialmente. - La proporción gruesa de contribución de reducciones de ProAmazonia (31%) versus el reporte nacional. 		<p>El costo por tCO2 se ha ajustado para reflejar el cambio en la reducción de emisiones acumuladas.</p>	



Conclusiones



- La meta de reducción de emisiones se ha cambiado.
- El resto de metas se mantienen iguales incluyendo las 57,430 ha convertidas a producción sostenible en las áreas priorizadas.
- Las otras cláusulas técnicas, financieras y legales permanecen iguales y continúan en implementación.
- Los informes presentados al donante y avance de metas deben realizarse sobre los ajustes mencionados.

Temas Varios

- a) Acompañamiento a comunidades sobre productos no maderables (MAG)
- b) Sistema de trazabilidad forestal (MAG)
- c) Delegación a la Gerencia para los pagos de las herramientas programáticas (PROAmazonía)



Acuerdos de Parte Responsable 2021



PLAN DE OPERATIVIZACIÓN PROAMAZONIA: “También se mantiene la delegación a la Gerencia de \$60.000 para el ciclo de las herramientas programáticas. Sin embargo, para aquellas herramientas que superen este valor, cada proceso será analizado de manera individual y se establecerá la necesidad de solicitar una delegación para cada uno al momento de realizar el POA anual, que también incluye las herramientas programáticas y que **será aprobado por el Comité Directivo.**”

No.	DESCRIPCION	INSTITUCIONES QUE SUSCRIBEN CONVENIO	UNIDAD PROGRAMÁTICA	PROYECTO	MONTO TOTAL	PERIODO		DELEGACIÓN - OPCIÓN 1	DELEGACIÓN - OPCIÓN 2	DELEGACIÓN - OPCIÓN 3	COMENTARIOS
						Fecha inicio	Fecha fin				
1	ACUERDO DE PARTES RESPONSABLES CENTRO AGRONÓMICO TROPICAL DE INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA (CATIE)	PNUD - CATIE	C2	GCF	USD 1,960,000.00	nov-20	nov-22	\$ 670,000.00	\$ 550,000.00	\$ 430,000.00	Pagos oscilan de USD 150.000 a USD 670.000
2	ACUERDO DE PARTES RESPONSABLES INSTITUTO HUMANISTA PARA LA COOPERACIÓN CON LOS PAÍSES EN DESARROLLO (HIVOS)	PNUD - HIVOS	C3	GCF	USD 1,088,000.00	feb-21 (por firmar)	may-22	\$ 320,000.00	\$ 260,000.00	\$ 200,000.00	Pagos oscilan de USD 100.000 a USD 250.000
3	CARTA DE ACUERDO INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACIÓN PARA LA AGRICULTURA (IICA)	PNUD - IICA	C2	GCF	USD 1,000,000.00	dic-20	jul-22	\$ 320,000.00	\$ 260,000.00	\$ 200,000.00	Pagos oscilan de USD 50.000 a USD 250.000
4	ACUERDO DE PARTES RESPONSABLES ASOCIACIÓN NACIONAL DE CULTIVADORES DE PALMA ACEITERA (ANCUPA)	PNUD - ANCUPA	C2	GCF	USD 328,270.40	nov-20	dic-21	\$ 115,000.00	\$ 120,000.00	\$ 100,000.00	Pagos oscilan de USD 41.000 a USD 115.000



¡GRACIAS!

¡Síguenos en Facebook y Twitter!



PROAmazonia

@PROAmazoniaEC

