DocuSign Envelope ID: 43863E5C-23B9-41F0-B844-F9C6A2A60673

ANEXO 2

TERMINOS DE REFERENCIA

TERMINOS DE REFERENCIA

A. Título del proyecto

No. DEL PROYECTO	*00102282*
TÍTULO DEL PROYECTO	*UN COLOMBIA MPTF*
No. DEL OUTPUT	*00104400*
FECHA DE TERMINACIÓN DEL PROYECTO	*31/12/2022*
AGENCIA	*PNUD-OCR*
TÍTULO DE LA CONSULTORIA / SERVICIO	*Evaluación externa final de la primera Fase del Fondo Multidonante de las Naciones Unidas para el Sostenimiento de la Paz (MPTF por sus siglas en inglés)*

B. Descripción del proyecto

1. Antecedentes

En febrero 2016, se estableció el Fondo Multidonante de las Naciones Unidas para el Sostenimiento de la Paz con el objetivo de financiar una respuesta coordinada de estabilización, alistamiento e implementación temprana del Acuerdo Final para la Terminación del Conflictoel Acuerdo Final. Enmarcado en los lineamientos establecidos por el Documento CONPES, el Fondo fue creado para atender las prioridades temáticas y territoriales establecidas por el entonces Consejo Interinstitucional del Posconflicto, a través de la Junta Directiva de Colombia en Paz. En un primer momento se establecieron las siguientes funciones:

DocuSign Envelope ID: 43863E5C-23B9-41F0-B844-F9C6A2A60673

1. Financiar el alistamiento para la implementación de el Acuerdo Final para la terminación del conflicto.
2. Financiar la Estrategia de Respuesta Rápida (ERR), la cual buscaba generar confianza a partir de victorias tempranas en las comunidades afectadas por el conflicto armado, de acuerdo a la priorización temática establecida por el Gobierno.
3. Financiar la implementación temprana de el Acuerdo Final para la terminación del conflicto.
4. Lograr consolidar los programas de construcción de paz del SNU en Colombia bajo la sombrilla del Fondo, creando eficiencias y sinergias.
5. Alinear las acciones de las agencias del SNU con las prioridades nacionales o aquellas definidas por el Gobierno de Colombia en el marco de el Acuerdo Final para la terminación del conflicto.

Los **objetivos estratégicos** definidos para la primera fase del Fondo fueron los siguientes:

1. Aumentar la confianza de las comunidades locales en el Estado y en las autoridades locales como garantes del Estado de Derecho, del imperio de ley y como facilitadores de un marco de reglas de juego e instituciones para la construcción democrática y participativa de paz territorial.
2. Aumentar la confianza en el proceso de paz y su potencial transformador para mejorar la vida cotidiana de las personas y en particular de las víctimas y de los/las ciudadanas en los territorios más afectados por el conflicto armado y la violencia.
3. Evitar/mitigar y/o confrontar fenómenos de criminalidad y rebrotes de violencia asociada al conflicto armado y a la desmovilización, y reducir la afectación de la coerción y la violencia (real y percibida) en las personas.
4. Gestionar situaciones de conflicto comunitario o social a través de intervenciones tempranas que resuelvan o al menos canalicen las demandas sociales y comunitarias hacia procesos de diálogo democrático, evitando que se mine la credibilidad en el proceso de paz y su implementación.
5. Obtener logros tempranos en materia de seguridad, justicia y desarrollo que permitirían el manejo oportuno de eventos críticos que pudieran presentarse y poner en peligro la paz.

Por su importancia, esta primera etapa de construcción de paz, no pudo esperar la finalización de las negociaciones en Habana. Las primeras intervenciones del Fondo contribuyeron a mover información en torno a el Acuerdo Final y a generar condiciones favorables para iniciar la implementación de el Acuerdo Final una vez estos fueron firmados. Para cumplir con estos objetivos, el Fondo alineó su plan de trabajo a los resultado establecidos en la ERR que contemplaba ocho resultados organizados en cinco ámbitos temáticos:

Figura 1: Marco de Impácto y Resultados primera fase del Fondo:

DocuSign Envelope ID: 43863E5C-23B9-41F0-B844-F9C6A2A60673

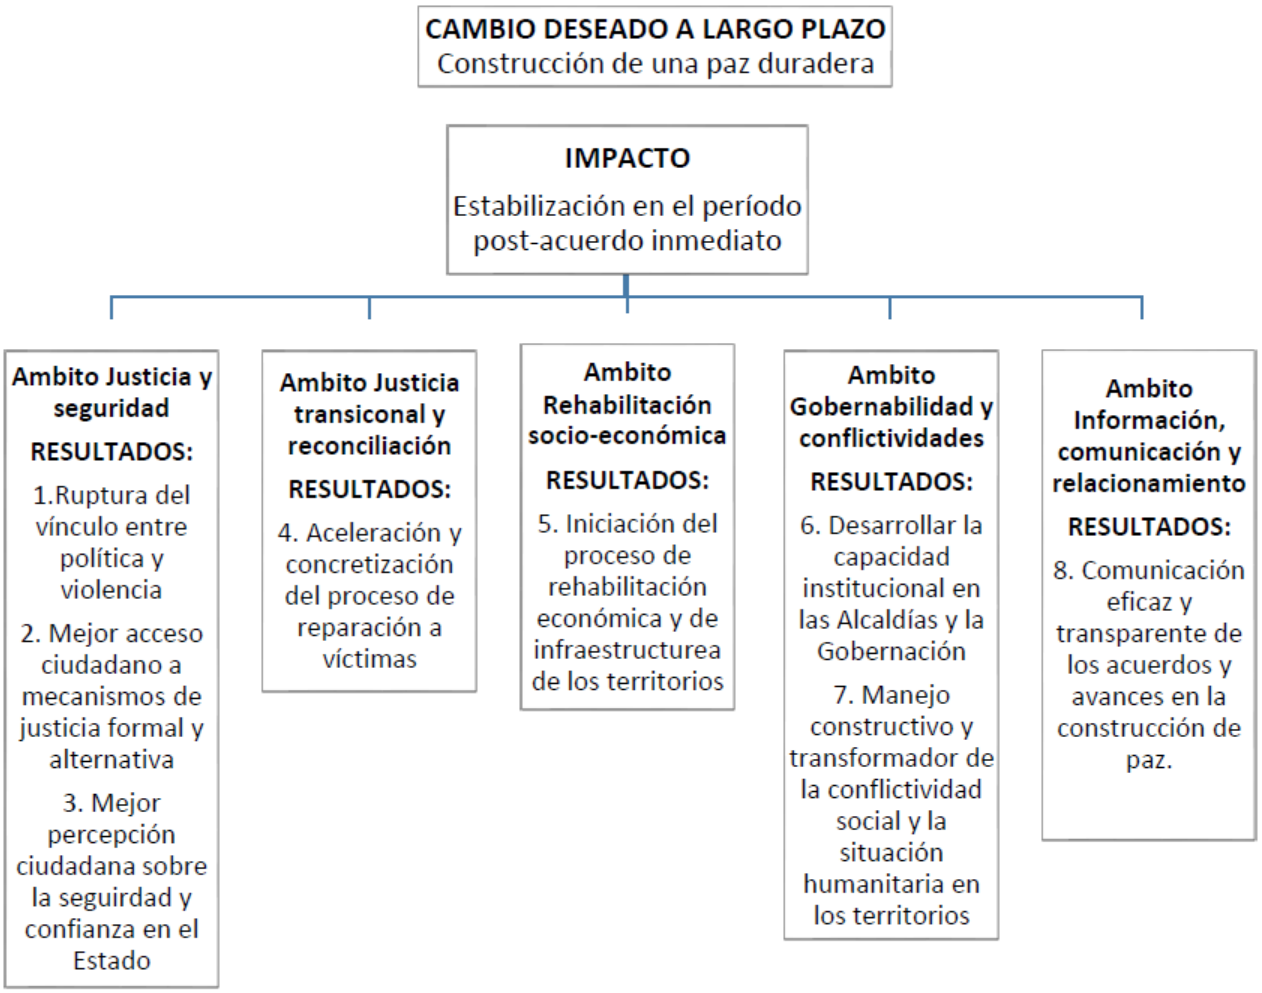

La primera fase tuvo una asignación de recursos por 87 millones de dólares a 115 proyectos. En el Anexo No. 2 se incluye la desagregación de lo proyectos financiados, incluyendo: ámbito, contrapartes, organizaciones implementadoras, montos y el estado actual de la implementación. Los proyectos resaltados en gris fueron objeto de algún tipo de evaluación.

Gobernanza y descripción general del Fondo

El Fondo está gobernado por un Comité de Dirección, co-presidido por el Alto Consejero para la estabilización y la Coordinador Residente a.i. de las Naciones Unidas, apoyado por una Secretaría Técnica y administrado por la Oficina de Fondos de Participación Múltiple (MPTFO) de las Naciones Unidas. De esta manera, el Fondo representa una alianza estratégica importante entre el Gobierno colombiano, las Naciones Unidas y la comunidad internacional, los cuales trabajan conjuntamente para avanzar en la agenda de paz, estabilización y consolidación de los territorios en Colombia.

DocuSign Envelope ID: 43863E5C-23B9-41F0-B844-F9C6A2A60673

Los proyectos financiados por el Fondo son revisados por el Comité Técnico, que está conformado por expertos técnicos de las entidades de Gobierno (APC, Cancilleria, Fondo Colombia en Paz, DNP), expertos de los países donantes, un representante de la sociedad civil y un representante del Sistema de Naciones Unidas con mandato/experticia en la temática. La revisión del Comité garantiza la calidad técnica de los proyectos y la pertinencia de la intervención en términos de la alineación con las prioridades de Gobierno, la coordinación con las actividades previas existentes y la consulta con las entidades nacionales pertinentes.

Es un requerimiento del Fondo que los proyectos incorporen diferentes enfoques transversales en su implementación cómo género, sostenibilidad ambiental, derechos humanos, acción sin daño y derecho a la participación. Por ser fundamentales, la incorporación de los enfoques de género y sostenibilidad ambiental son evaluados a nivel de formulación de proyectos por dos consultores previo a la revisión de los proyectos en el marco del Comité Técnico. De est forma los proyectos los proyectos reciben recomendaciones por parte de los consultores para ser integrados a los proyectos.

El Fondo opera a través de dos ventanas de implementación, una ventana para agencias, fondos y programas del Sistema de Naciones Unidas y otra para organizaciones de la Sociedad Civil.

Los proyectos aprobados por el Fondo tienen dos niveles de implementación esenciales para la estrategia de estabilización y consolidación de los territorios:

a. **Enfoque Institucional:** proyectos que impulsan tanto la arquitectura institucional creada en el Acuerdo Finalel Acuerdo Final y que es fundamental para su implementación del Acuerdo Final, cómo el fortalecimiento de entidades ya existentes que deben adpatarse a las necesidades establecidas por el Acuerdo Final.

b. **Enfoque Territorial:** Proyectos que llevan dividendos de paz a los territorios más afectados por el la violencia y la pobreza. Los proyectos apoyados bajo este enfoque incluyen apoyo a la estrategia y formalización de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), construcción de infraestructura a través de empleo local, desminado humanitario, acceso justicia local, mejoramiento al acceso de servicios básicos como salud y agua y saneamiento, prevención de reclutamiento y entornos productivos para la reincorporación de excombatientes, entre otros.

2. Objetivos

a) El objetivo de la evaluación final de la primera fase del Fondo Multidonante de las Naciones Unidas para el Sostenimiento de la Paz es generar evidencia sobre su eficiencia y efectividad como mecanismo para el fortalecimiento de capacidades nacionales y locales, y de movilización y coordinación de financiación para intervenciones catalíticas en apoyo a la consolidación y estabilización de los territorios en Colombia. Con un énfasis en el proceso de generación de lecciones aprendidas, últiles para el Gobierno Nacional, otros Fondos y para el sistema de cooperación internacional.

DocuSign Envelope ID: 43863E5C-23B9-41F0-B844-F9C6A2A60673

b) **Objetivos específicos**

1. Conforme a las causas de la violencia y la pobreza (ver Anexo No. 3) que llevaron a la definición de los puntos del Acuerdo Final, evaluar la relevancia del accionar del Fondo en la aprobación y apoyo de proyectos que propendan por disminuir estos factores.
2. Identificar las líneas programáticas del Gobierno Nacional para dar cumplimiento al Acuerdo Final, y determinar el aporte estratégico del Fondo a aquellas relacionadas con el plan de trabajo para la primera fase.
3. En el contexto de implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) como mecanismos para asegurar condiciones que favorecen la construcción de paz, establecer el aporte del Fondo a su materialización, así como las acciones necesarias para alcanzar las metas de los ODS relacionadas con la construcción de paz.
4. Evaluar la eficiencia y efectividad del Fondo en la implementación de los enfoques transversales en las intervenciones que lidera.
5. Generar análisis sobre el impacto del Fondo como mecanismo de financiación de intervenciones catalíticas para la atención de las prioridades establecidas por el Gobierno Nacional en las fase de ERR y alistamiento temprano del Acuerdo Final.
6. Evaluar si los resultados y recomendaciones de la evaluación de medio término llevada a cabo en 2018 fueron acogidas por el Fondo para mejorar su funcionamiento, gestión e impacto.
7. Evaluar en que medida se han implementado estrategias y mecanismos efectivos para asegurar la sostenibilidad de los resultados de los proyectos financiados, con énfasis en la creación y fortalecieminto de capacidades nacionales y locales.
8. Evaluar el impácto de las intervenciones financiadas por el Fondo.

Nota: El evaluador debe considerar que el Fondo inició su accionar en el marco de la Estrategia de Respuesta Rápida que tenía 8 resultados como prioridades. Estos resultados fueron cambiando conforme al cambio también de prioridades gubernamentales. Estos ajustes coyunturales y programáticos deben verse reflejados en los análisis desarrollados.

C. Alcance de los servicios, resultados esperados y conclusión del objetivo

3. **Alcance**

Esta será una evaluación de la respuesta del Fondo a la tarea de ayudar a alinear e integrar las acciones de las Naciones Unidas de acuerdo a las prioridades del Gobierno, y a movilizar y coordinar la financiación para intervenciones estratégicas inmediatas de acuerdo con el objetivo del fondo.

En este sentido la evaluación cubrirá el compendio de políticas y líneas programáticas definidas por el Gobierno Nacional para la implementación del Acuerdo Final, plasmadas en el Plan de Trabajo del Fondo para su primera Fase. Lo anterior, enmarcado en análisis sobre el aporte general del Fondo a estas líneas, y por consiguiente a la disminución de las causas del conflicto.

DocuSign Envelope ID: 43863E5C-23B9-41F0-B844-F9C6A2A60673

Para esto, el evaluador deberá considerar el estudio de los proyectos y el análisis de múltiples variables de contexto, con consideración a los cambios políticos, económicos y sociales acaecidos durante los tres años de implementación de la primera Fase del Fondo.

4. Criterios de Evaluación y Preguntas Guía

Los criterios y preguntas guía pueden ser modificados en caso de que el proponente presente una matriz de evaluación en la que se incluyan criterios adicionales u otras preguntas relevantes. La categorización para la medición de los criterios debe ser propuesta por el evaluador externo.

Relevancia: carácter estratégico y catalítico de la intervención frente a las casusas del conflicto y en contribución a la consolidación de los territorios y el sostenimiento de la paz.

- ¿El marco de resultados del Fondo aborda las causas del conflicto armado identificadas en el Acuerdo Final? ¿los objetivos propuestos en la primera fase fueron adecuados al contexto de respuesta rápida e implementación temprana del Acuerdo Final?
- ¿En qué medida las intervenciones del Fondo han contribuido a los objetivos y prioridades de la agenda de consolidación de los territorios del Gobierno Nacional en los primero años de implementación del Acuerdo Final y los cinco ámbitos temáticos priorizados?
- ¿Los resultados de los proyectos han contribuido a estabilizar a las regiones y comunidades más vulnerables y a generar mayor confianza en el Estado generando condiciones favorables para la implementación del Acuerdo Final y desalentando las causas de la violencia?
- ¿Cómo han contribuido los proyectos apoyados por el Fondo a la consecución de los objetivos incluidos en la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad mediante la cual se dictan medidas a los Estados Miembros para aumentar la participación de las mujeres en todos los niveles de toma de decisiones e incorporar una perspectiva de género en todas las operaciones?
- Cuál ha sido el aporte de los proyectos del Fondo a otros enfoques diferenciales (Medio Ambiente, Enfoque de Derechos Humanos, en víctimas, generacional, etc.)

Eficacia: Cumplimiento de los resultados y objetivos propuestos para el MPTF.

- ¿Cómo cumplió el Fondo con su tarea de movilizar y coordinar la financiación para intervenciones estratégicas para la consolidación de los territorios y el sostenimiento de la paz?
- ¿Cuáles han sido los principales factores que influyeron en el logro o no logro de los resultados y objetivos propuestos?
- ¿Han sido eficaces los procedimientos y la gestión de la Secretaría Técnica para la materialización de las intervenciones?
- ¿Cuál es el grado de adaptabilidad del Fondo ante las coyunturas que se presentan en el proceso de consolidación de los territorios y en la realidad nacional en general?
- ¿la gobernanza del Fondo fue un factor que contribuyó a la gestión de cooperación internacional para los objetivos del Fondo?

DocuSign Envelope ID: 43863E5C-23B9-41F0-B844-F9C6A2A60673

- ¿se logró apoyar el fortalecimiento de la sociedad civil y las comunidades a través de los proyectos financiados por el Fondo?
- ¿El Fondo ha logrado tener un impácto en el avance del paí para la consecución de las metas de los ODS?

Eficiencia: Cumplimiento de los resultados y objetivos propuestos con relación a los recursos disponibles. Esto incluye el análisis de ventajas comparativas del Sistema de Nanciones Unidas con presencia en Colombia.

- ¿Qué resultados estratégicos a nivel nacional y local, se han obtenido a partir de las intervenciones del Fondo, en los ámbitos de intervención?
- ¿Los proyectos han dado un uso eficiente a los recursos aportados por el Fondo? ¿Han aportado contrapartidas y apalancado nuevos recursos para complementar las intervenciones?
- ¿Ha resultado eficiente la coordinación con entidades gubernamentales del orden local y nacional, para el desarrollo de las intervenciones en cada uno de los ámbitos de intervención?
- ¿Qué ventajas comparativas se pueden evidenciar en los proyectos implementados por las agencias del SNU vs los proyectos implementados por las organizaciones de la Sociedad Civil?
- ¿Los proyectos interagenciales han demostrado un uso más optimo de los recursos que los proyectos implementados por una sola agencia?
- ¿Los indicadores incluidos en los marcos de resultados de los proyectos han sido adeucados para medir los resultados e impácto de las intervenciones? ¿Existen recomendaciones específicas?.

Impacto: Incidencia en macro procesos en el contexto de consolidación de los territorios, a la vez que analiza el valor agregado de los proyectos financiados.

- ¿Cuáles fueron los principales aportes del Fondo y de los proyectos apoyados a la estrategia de respuesta rápida y la implementación temprana del Acuerdo Final?
- ¿El Fondo apoyó la creación de condiciones favorables para la implementación del Acuerdo Final?
- ¿Cómo se han fortalecido las capacidades de las instituciones del orden local y nacional en el marco de los proyectos financiados por el fondo?
- ¿Qué diferencias en la calidad de vida de las distintas poblaciones participantes de las intervenciones pueden ser atribuidas al Fondo (mujeres, hombres, NNA, comunidades étnicas, víctimas)?
- ¿Hay impactos no deseados (incluida la consideración de diferentes segmentos de la sociedad)?
- ¿Cuáles fueron las coyunturas o características contextuales que afectaron de alguna forma el impacto del Fondo?
- ¿Se encuentran diferencias en los resultados generados por proyectos implementados por más de un agencia del sistema (interagenciales) que los proyectos implementados por sólo una agencia?
- ¿Cuál es el valor agregado de los proyectos financiados por el Fondo como apoyo a los esfuerzos realizados por los Gobiernos Nacionales en la búsqueda de la pasa y la consolidación de los teritorios?.

DocuSign Envelope ID: 43863E5C-23B9-41F0-B844-F9C6A2A60673

Sostenibilidad: Apropiación de los resultados y capacidad instalada que permite dar continuidad o replicar los beneficios obtenidos. Debera incluir el análisis de lecciones aprendidas, mejores prácticas y oportunidades. Adicionalmente, se tomará en consideración la medida en que los beneficiarios, las entidades públicas y la sociedad civil hayan participado de los procesos de planeación, implementación y monitoreo de los proyectos.

- ¿Cuáles son las variables de sostenibilidad más relevantes a tomar en cuenta en el análisis de la primera fase del Fondo?
- ¿Cuáles son los factores que permiten o disminuyen la sostenibilidad de los resultados alcanzados por este mecanismo en su primera fase?
- ¿Hasta qué punto es probable que los cambios generados por la intervención del Fondo se mantengan en el largo plazo?
- ¿En qué niveles, en términos políticos, económicos y sociales, se ha generado capacidad instalada y esta asegura la sostenibilidad de los resultados alcanzados por el Fondo?
- ¿Los proyectos han involucrado a los beneficiarios y a las instituciones de varios niveles en las diferentes etapas de los proyectos, buscando de esta forma la apropiación y sostenibilidad de las intervenciones?.
- ¿Se pueden encontrar evidencias del desarrollo de capacidades institucionales nacionales y locales promovidas por el Fondo que se hayan sostenido en el tiempo?
- ¿Los proyectos incluyeron estrategias de gestión de conocimiento, sistematización de buenas prácticas y lecciones aprendidas que hayan contribuido a generar evidencia de los resultados y contribuir con los procesos futuros o con intervenciones nuevas?
- ¿Cómo se puede calificar la estrategia de gestión de conocimiento implementada por los proyectos apoyados por el Fondo.
- ¿Existe evidencia de articulación de las intervenciones con el sector privado que hayan generado opciones para una mayor sostenibilidad?.

5. Productos esperados

No.	Entregable /Productos	Tiempo de entrega después de firmado el contrato.	Tiempo estimado para revisión y aceptación (Días Calendario)	Revisión y aceptación a cargo de (cargo e institución)	Peso porcentual en la consultoría
1	Informe inicial de la evaluación final / Inspection Report (aprox. 10 páginas). Debe incluir la propuesta metodológica, el alcance de la evaluación, un diagnóstico de la información disponible resaltando los límites en caso de que se identifiquen vacíos de información, una matriz de evaluación, instrumentos de recolección de información a utilizar, cronograma de entrevistas y visitas de campo y propuestas de preguntas de evaluación. Partiendo de las necesidades de una muestra representativa de proyectos, debe detallar	20 días	5 días	Secretaría Técnica MPTF	20 %

DocuSign Envelope ID: 43863E5C-23B9-41F0-B844-F9C6A2A60673

	la comprensión de los evaluadores sobre lo que van a evaluar y por qué. En caso de ser necesario se compartirá la metodología con representantes del Comité Técnico con el fin de obtener el aval de las partes frente a la metodología y matriz de evaluación.				
2	Borrador del Informe de Evaluación final de la primera fase del MPTF con el propósito de obtener comentarios y recomendaciones de las principales contrapartes, del Gobierno, Donantes y Agencias del SNU de acuerdo con los criterios establecidos. (Estensión máximo 25 páginas)	60 días	10 días	Secretaría Técnica MPTF	30%
3	Informe Final de la Evaluación Final de la primera Fase del MPTF. El informe final debe incluir los resultados principales, las lecciones aprendidas y buenas prácticas identificadas, así como las recomendaciones.	90 días	10 días	Secretaría Técnica MPTF	40%
4	Insumo para un producto de difusión interactivo en el que se evidencie la consolidación de la primera Fase del Fondo y su aporte al proceso de implementación del Acuerdo Final, en el que se denote el aporte catalítico de su intervención. La audiencia de este producto será la comunidad en general.	100 días	5 días	Secretaría Técnica MPTF	10%

Nota: El trabajo se puede hacer fuera de las oficinas. Se deben hacer entrevistas a los diferentes miembros de los Comités del Fondo, socios estratégicos y visitas a terreno a proyectos seleccionados en una muestra representativa.

e. Metodología Propuesta

La metodología deberá basarse en el documento de la OCDE: *"Evaluating Peacebuilding Activities in Settings of Conflict and Fragility",* que contempla el desarrollo de evaluaciones que consideren el aporte de la cooperación internacional a la disminución de las causas estructurales o coyunturales de los conflictos. Conforme a esa metodología esta evaluación tiene un doble propósito de rendir cuentas a los miembros del Fondo, a la vez que se enfoca en la gestión del conocimiento adquirido en lecciones aprendidas y oportunidades de mejora.

DocuSign Envelope ID: 43863E5C-23B9-41F0-B844-F9C6A2A60673

f. Preparación del plan de trabajo:

El equipo evaluador contratado deberá familiarizarse con el Fondo y previo a la presentación del Plan de Trabajo, preparar la siguiente información:

1.Revisión documental

Una vez firmado el contrato deberá adelantarse una reunión entre la firma y la Secretaría Técnica del Fondo, en la que ésta última, presentará el acervo informativo del Fondo, en aras de que la firma solicite la información que consiodere pertinente para el desarrollo de la información.

La revisión documental debe incluir el siguiente material, adicional a la información sobre los proyectos:

- Documento CONPES 3850 Fondo Colombia en Paz
- Documento CONPES 3867 Estrategia de Preparación Institucional para la paz y el Posconflicto
- Umbrella Arrangement Colombia UN MPTF – 150216
- Acuerdo Marco
- Memorándum de entendimiento con las agencias del SNU
- SAA Colombia UN MPTF – 140316
- Decreto 691 del 27 de abril de 2017
- Estrategia de Respuesta Rápida
- Manual Operativo del Fondo Fase 1
- Términos de Referencia del Fondo Fase 1 y 2
- Informes anuales del Fondo
- Fichas trimestrales de los proyectos del Fondo y fichas consolidadas por ámbito
- Informes de seguimiento y visitas de monitoreo.
- Informe de Evaluación de medio término de la fase 1
- Informes Anuales de los proyectos y convocatorias
- Documentos nacionales relevantes.
- Otros documentos relacionados
- Documentos nacionales e internacionales relevantes para la inclusión del enfoque de género y derechos humanos
- Programas País de los programas, fondos y agencias especializadas de la ONU suscritos con el Gobierno para el periodo 2015-2020
- Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible - UNDAF 2015-2019
- Plan Marco de Implementación (PMI)

DocuSign Envelope ID: 43863E5C-23B9-41F0-B844-F9C6A2A60673

2.Entrevistas con los actores y socios a ser programadas considerando las afectaciones de movilidad que puede representar el COVID-19.

- La Secretaría Técnica le facilitará los contactos de los socios estratégicos que serán entrevistados. Entre los socios estratégicos se encuentran representantes de las siguientes entidades:

  - **Gobierno:** Consejería para la Estabilización y la Consolidación, Agencia Presidencial para la Cooperación Internacional (APC Colombia), Ministerio de Relaciones Exteriores, Departamento Nacional de Planeación (DNP), Unidad de Atención y Reparación Integral a Víctimas (UARIV), Agencia de Renovación del Territorio (ART), Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN), Instancias del SIVJRNR, autoridades locales, entre otras.
  - **Donantes:** Reino Unido, Noruega, Alemania, United Nations Peace Builfding Fund, Canadá, Suecia, Suiza, Fondo WPH, España, Irlanda, Emiratos Árabes, República de Corea, Finlandia, Nueva Zelanda, Chile, Portugal.
  - **Secretaría Técnica del Fondo**
  - **Naciones Unidas:** ver Tabla N° 1 del Anexo No. 1.
  - **Organizaciones de la Sociedad Civil:** ver Tabla N° 2 del Anexo No. 2
  - **Participantes de los proyectos.**

Anexo frente a la contingencia del COVID 19

El 9 de marzo de 2020, el Director General de la OMS recomendó, en relación con el COVID-19, que los países adapten sus respuestas a esta situación, de acuerdo al escenario en que se encuentre cada país, invocó la adopción prematura de medidas con un objetivo común a todos los países: detener la transmisión y prevenir la propagación del virus. En Colombia estas medidas, aunque más flexibles a la fecha de expedición de los presentes términos de referencia, pueden variar conforme al aumento de contagios que el Ministerio de Salud y Protección Social preveé, luego de la apertura de los renglones económicos y la finalización de la cuarente obligatoria.

En este sentido, es necesario que la propuestas que se presente incluya:

1. Una descripción detallada de las actividades para la recolección de información que se adelantarán, en caso tal de que el país entre en cuarentena generalizada o se establezcan restricciones a la movilidad en el territorio nacional. Este anexo debe incluir los medidas alternativos de recolección de información, así como una explicación de cómo estas actividades garantizarán que las necesidades de información, en calidad y cantidad, serán cubiertas.

DocuSign Envelope ID: 43863E5C-23B9-41F0-B844-F9C6A2A60673

3.Visitas a los proyectos en terreno y a nivel central

- El equipo evaluador seleccionará con el apoyo de la Secretaria Técnica los proyectos que se considere pertinente visitar para la recolección de evidencia. Lo anterior, bajo estrictos criterios de economía y eficiencia y bajo las condiciones actuales de bioseguridad.
- En el caso de los proyectos en terreno, la Secretaría Técnica facilitará los contactos de los equipos de proyectos para programar las visitas. Lo mismo se realizará para el caso de los proyectos que se implementan en Bogotá.

Con esta información el evaluador deberá entregar un plan de trabajo, con cronograma detallado que incluya:

- Acervo informativo (cuantitativo y cualitativo) requerido
- Cronograma de visitas
- Información sobre las entrevistas con donantes y socios claves
- Matriz de Evaluación
- Preguntas de evaluación
- Metodologías para la recolección y análisis de la información.

g. Elaboración de los Informes preliminares y finales de la Evaluación

El equipo de evaluadores trabajará en la elaboración del documento.

h.Presentación y validación del Informe preliminar de la Evaluación

La Secretaría Técnica revisará el diseño metodológico y el plan de trabajo y dará las recomendaciones correspondientes que deberán ser incorporadas a los productos.

Para la revisión y aprobación de las propuestas se conformará un Comité Evaluador formal y participativo que tendrá vigencia durante todo el proceso de evaluación con el objetivo de promover la apropiación, credibilidad y uso final de la misma. Los informes preliminar y final de la evaluación de medio término serán revisados por los comités técnico y directivo del Fondo, quienes darán su visto bueno a ambos productos.

El Comité Evaluador estará conformado por un máximo de 4 personas representantes la Secretaría Técnica del Fondo.

DocuSign Envelope ID: 43863E5C-23B9-41F0-B844-F9C6A2A60673

i.Duración de los trabajos

6. Duración del contrato

La duración del contrato será de 150 días calendario

7. Supervisión

La supervisión del contrato estará a cargo del/la coordinador/a de la Secretaría Técnica del Fondo Multidonante de Naciones Unidas para el Sostenimiento de la Paz.

j.Localización de los trabajos

Sede del proveedor *en permanente contacto con el supervisor/a del contrato (Secretaría Técnica del Fondo).* Se llevarán a cabo cuatro (4) viajes a los lugares indicados a continuación para entrevistar a los implementadores de los proyectos a nivel territorial y a algunos/as beneficiarios/as.

Destino/s		**Duración estimada**	**Breve descripción de las razones del viaje**
De	**A**		
Bogotá D.C.	*Planadas, Tolima*	*3 días*	*Visitas y entrevistas a los proyectos y beneficiarios*
Bogotá D.C.	*Quibdó, Chocó*	*3 días*	*Visitas y entrevistas a los proyectos y beneficiarios*
Bogotá D.C.	*Vitahermosa, Meta*	*3 días*	*Visitas y entrevistas a los proyectos y beneficiarios*
Bogotá D.C.	*Anorí, Antioquia*	*3 días*	*Visitas y entrevistas a los proyectos y beneficiarios*

DocuSign Envelope ID: 43863E5C-23B9-41F0-B844-F9C6A2A60673

k.Calificaciones de los diferentes Proveedores de Servicios elegidos a varios niveles

a. Requisitos mínimos requeridos de la de la firma (el no cumplir los requisitos mínimos es causal de descalificación de la propuesta).

Experiencia especifica en la(s) siguiente(s) área(s)	El cumplimiento de la Experiencia de la firma se verificará a través de:
Minimo 3 años de experiencia sólida y demostrable en la evaluación, análisis y generación de conocimiento de políticas públicas, programas de desarrollo, fondos o proyectos relacionados con temas de construcción de paz, posconflicto, desarrollo y cooperación internacional. Trabajo previo con el Sistema de Naciones Unidas es favorable.	**x** Presentación de mínimo una certificación de un contrato prestado satisfactoriamente por un valor superior a **COP $ 200.000.000** **x** Presentación de minimo otras dos certificaciones de contratos prestados satisfactoriamente en los últimos dos años, por un monto inferior o igual al anterior.

b. Requisitos financieros de la de la firma: No aplican para la presente soliictud.

c. Equipo mínimo de trabajo requerido. El no cumplir conl el equipo minimo o los perfiles sollicitados serán causal de rechazo de la propuesta

Cargo*	**PERFILES: Formación académica y experiencia especifica. * (solo se tendrá en cuenta la experiencia a partir de la fecha de grado – no se tendrán en cuenta traslapos en las fechas)**
Coordinador/Director de la Evaluación	*Estudios:* • *Profesional en ciencias sociales, economía, estadística , o afines.* • *Especialización o Maestría en estadística, muestreo, análisis de datos, cooperación internacional, construcción de paz, ciencias sociales, o afines.*

DocuSign Envelope ID: 43863E5C-23B9-41F0-B844-F9C6A2A60673

Cargo*	PERFILES: Formación académica y experiencia especifica. * (solo se tendrá en cuenta la experiencia a partir de la fecha de grado – no se tendrán en cuenta traslapos en las fechas)
	Experiencia especifica: ✓ *8 años de experiencia especifica en evaluaciones de impácto o resultados a medio o largo plazo de política pública, programas de construcción de paz y planes de desarrollo y cooperación internacional.* ✓ *Metodologías de planificación y evaluación.* ✓ *Levantamiento de información cualitativa y cuantitativa aplicando metodologías participativas.* ✓ *Metodologías para planificación y gestión territorial.* ✓ *Conocimiento del contexto nacional actual.* ✓ *Experiencia en procesos de construcción de paz, posconflicto, derechos humanos, desarrollo y conflictos a nivel mundial.* ✓ *Integración de los enfoques transversales en evaluación, en particular el de género y derechos humanos* *Otros:*
Consultor experto en cooperación internacional, desarrollo y construcción de paz	*Estudios:* • *Profesional en ciencias sociales, economía, estadística , o afines.* • *Especialización o Maestría en cooperación internacional, construcción de paz, ciencias sociales, o afines.* *Experiencia especifica:* ✓ *4 años de especifica en implementación y/o evaluación de políticas, programas o proyectos para la construcción de paz.* ✓ *Mecanismos de cooperación internacional.* ✓ *Procesos de paz* ✓ *Desarrollo en escenarios pos conflicto.*
Consultor experto en metodologías para la recolección de información primaria y secundaria y análisis de datos cualitativos	*Estudios:* ✓ *Profesional en ciencias sociales, economía, estadística, o afines.* ✓ *Deseable especialización en investigación social, cooperación internacional, construcción de paz.* *Experiencia especifica:* ✓ *3 años de experiencia especifica en levantamiento y análisis de información cualitativa aplicando métodos participativos.* ✓ *Metodología de investigación cualitativa, grupos focales y*

DocuSign Envelope ID: 43863E5C-23B9-41F0-B844-F9C6A2A60673

Cargo*	PERFILES: Formación académica y experiencia especifica. * (solo se tendrá en cuenta la experiencia a partir de la fecha de grado – no se tendrán en cuenta traslapos en las fechas)
	entrevistas directas. ✓ *Experiencia comprobada en aplicación del enfoque de igualdad de género, enfoque medio ambiental y derechos humanos en evalución.*
Consultor en análisis de datos cuantitativos y uso de programas estadisticos	*Estudios:* • *Profesional en ciencias sociales, economía, estadística, o afines.* • *Deseable especialización en estadística, muestreo, análisis de datos, cooperación internacional, construcción de paz, ciencias sociales, o afines.*
	Experiencia especifica: ✓ *3 años de experiencia especifica en levantamiento y análisis de información cuantitativa, muestreo y evaluación de políticas, proyectos, programas o fondos.* ✓ *Experiencia en la construcción de herramientas de recolección de información y sistematización de datos.* ✓ *Experiencia en la evaluación de programas o proyectos de construcción de paz.*

*Se deben anexar las copias de los títulos profesionales y certificaciones de experiencia especifica solicitada para cada uno de los profesionales.

Los oferentes deberán anexar debidamente firmada por el profesional propuesto, la carta de compromiso.

8. Ámbito de los precios de la propuesta y calendario de pagos

El contrato es un precio fijo basado en resultados al margen de la ampliación de la duración específica de este documento.

Se harán los pagos contra entrega de los productos de la siguiente manera:

Forma de pago

Entregable /Productos	%
Producto 1	20%
Producto 2	30%
Producto 3	40%
Producto 4	10%

DocuSign Envelope ID: 43863E5C-23B9-41F0-B844-F9C6A2A60673

Nota: El PNUD por generalidad no otorga anticipos.

9. Indemnización fijada **Convencionalmente:**

Se impondrá como sigue:

Porcentaje del precio del contrato por semana de retraso: 2.5%

N.º máx. de **semanas** de retraso: 4

Tras los cuales el PNUD puede cancelar el contrato

10. Modificaciones

Cualquier modificación a este Contrato exigirá una enmienda por escrito entre ambas partes, debidamente firmada por el representante autorizado del Contratista y por el Representante autorizado del PNUD/OCR.

11. Lugar de la entrega de las facturas y nombre de la persona encargada de recibir las facturas:
Diana Heredia – Analista de Programa, diana.heredia@one.un.org , – Calle 84 A #10-50 Piso 3, Bogotá D.C., TEL. 4889000

12. Presentación de facturas

1 El Contratista enviará una factura original para cada pago a ser efectuado conforme al presente Contrato
2 La(s) factura(s) presentada(s) deberá(n) contener la siguiente información:

- Un número que corresponda a un sistema de numeración consecutiva, por computador o en su defecto, PREIMPRESO y (2) apellidos y nombre ó razón social y NIT de la firma (si se trata de una empresa nacional)
- La factura se debe dirigir a nombre del Programa **de las Naciones Unidas Para el Desarrollo – PNUD Proyecto 00102282.**
- La(s) factura(s) deberá(n) traer discriminado el valor del IVA (si aplica).
- Los pagos serán efectuados por PNUD al proveedor mediante Giro bancario a la cuenta que el proveedor informe

DocuSign Envelope ID: 43863E5C-23B9-41F0-B844-F9C6A2A60673

Anexo 1. Listados Organizaciones Ventanas Naciones Unidas y Sociedad Civil

Tabla N° 1.

Agencias de Naciones Unidas que implementan proyectos del MPTF
PNUD
FAO
OIM
ONU MUJERES
UNFPA
UNICEF
OPS
ACNUR
PMA
UNMAS – UNOPS
ONU DERECHOS HUMANOS (colaboración no recibe recursos)

Tabla N° 2.

Organizaciones Ventana de Sociedad Civil
Acción Cultural Popular
Acumen
Aldeas Infantiles SOS Colombia
ASCOLEMAD
Asociación Campesina del Valle del Río ACVC
Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca

DocuSign Envelope ID: 43863E5C-23B9-41F0-B844-F9C6A2A60673

Organizaciones Ventana de Sociedad Civil
Asociación de Productores Ecológicos de Planadas, ASOPEP
Asociación JUNPRO
Asociación Movimiento Feminista por la Paz Ruta Pacífica de las Mujeres
Asociación Municipal de Mujeres – ASOM
Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina de Colombia-ANZORC
ATEXX
Ayuda Popular Noruega
Bancoldex
Campaña Colombiana Contra Minas
Casa Mujer
Centro de Investigación y Educación Popular - CINEP
Centro de Pensamiento y diálogo político - CEDIPO
Centro de Recursos para Análisis de Conflictos -Cerac
Centro Internacional de Toledo para la Paz - CITpax
Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género - HUMANAS
CINCCO
Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo - CCJAR
Colectivo Orlando Fals Borda
COLOMBIA DIVERSA
Comisión Colombiana de Juristas
Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina Integral del Atrato COCOMACIA
Consultoría para los derechos humanos y el desplazamiento - CODHES
Contravía
Corpocampo
Corporación 8 de marzo. Mujeres y hombres por la igualdad
Corporación Casa de la Mujer
Corporación Centro de Apoyo Popular - CENTRAP

DocuSign Envelope ID: 43863E5C-23B9-41F0-B844-F9C6A2A60673

Organizaciones Ventana de Sociedad Civil
Corporación de Apoyo a Comunidades Populares -CODACOP
Corporación de Mujeres Eco feministas (COMUNITAR)
Corporación para el Desarrollo Social, Tecnológico y Económico de Colombia (CORPDESARROLLO)
Corporación Región
Corporación Regional Para La Defensa De Los Derechos Humanos - CREDHOS
Corporación Sisma Mujer
Corporación Tiempo de Mujeres
Corporación Vamos Mujer
Corporación Viva la Ciudadanía
Corporación Yira Castro
Escuela Nacional Sindical
Federation Handicap International
Fenalper
FISH
Fundación Antonio Restrepo Barco
Fundación CINDE Colombia
Fundación Circulo de Obreros de San Pedro Claver
Fundación el Arte de vivir
Fundación Existir para la Paz, la Convivencia y la Justicia en Equidad. "FUNDEXCO"
Fundación Franciscana
Fundación Fraternidad
Fundación para el Desarrollo Comunitario de Samaná - Fundecos
Fundación para la Libertad de Prensa - FLIP
Fundación Plan
Fundación Progresar Norte de Santander
Fundación reconciliación
Fundación Save The Children

DocuSign Envelope ID: 43863E5C-23B9-41F0-B844-F9C6A2A60673

Organizaciones Ventana de Sociedad Civil
Fundación Surcos de Vida ONG - Regional Nariño
IC Fundación
Incofin
Instituto Kroc
Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad - LIMPAL
Mercy Corps
Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado - MOVICE
Organización Femenina Popular - OFP
Organización Nacional Indígena de Colombia - ONIC
PASO Colombia
Pastoral Social
PERIGEO
Proyectamos Colombia
Red Cantoyaco
Red de Mujeres Chaparralunas por la Paz
Red de Mujeres del Norte del Cauca - Redmunorca
Red Nacional de Mujeres
REDEPAZ
Supracafé
Tejido mujer
The Halo Trust
Universidad de Ibagué
VICE MEDIA SAS - ¡PACIFISTA!

Anexo No. 2. Listado de proyectos Fase 1

Ámbito 1: Justicia y Seguridad (resultados 2 y 3)

DocuSign Envelope ID: 43863E5C-23B9-41F0-B844-F9C6A2A60673

Ámbito 3: Rehabilitación Socio-económica (resultado 5)

Ámbito 4: Gobernabilidades y conflictividades (resultados 6 y 7)

Proyecto	Contraparte de Gobierno	Implementador	Estado	Monto Aprobado (con GMS)
Fortalecimiento de capacidades para la implementación de la paz y la ERR	ART OACP	PNUD	Finalizado	$ 3.714.250
Manos a la obra para la paz I	ART	PNUD	Finalizado	$ 2.100.000
Manos a la paz	Alcaldias Locales	PNUD	Finalizado	$ 949.393
Territorialización en la implementación de la ERR y despliegue de mecanismos de transparencia y comunicación	ART	OIM	Finalizado	$ 1.753.851
Asistencia técnica para la creación y fortalecimiento de los Sistemas Locales de Justicia en 13 municipios priorizados en Colombia.	Ministerio de Justicia	PNUD	Finalizado	$ 1.300.000
Convocatoria Desminado 1 - Proyecto de acción integral contra minas en la zona 3 del municipio de Mesetas –Meta	Descontamina	APN	Finalizado	$ 515.000
Convocatoria Desminado 1 - Inicio de las actividades de liberación de Tierras, desarrollo de estrategias de ERM y AIV en el municipio de Algeciras (Huila)	Descontamina	CCM	Finalizado	$ 515.000
Convocatoria Desminado 1 - Enfoque Integral para la Acción contra las Minas Antipersonal- MAP, Munición sin explotar- MUSE y Artefactos Explosivos Improvisados AEI, para el municipio de Cajibío del departamento del Cauca.	Descontamina	HANDICAP	Finalizado	$ 515.000
Convocatoria Desminado 1 - Acción Integral contra minas antipersonal en el municipio de Chaparral- Construyendo paz desde los territorios	Descontamina	HALO TRUST	Finalizado	$ 515.000
Convocatoria Desminado 1 - Educación en el riesgo por MAP, MUSE Y AEI en 25 municipios de alta Afectación, en el marco de la estrategia de Respuesta Rápida (ERR) del Gobierno de Colombia	Descontamina	FUNDACION R.B.	Finalizado	$ 257.283
Convocatoria Desminado 1 - Educación en el riesgo de minas en situaciones de emergencia en veinte municipios de los dptos de Antioquia, Chocó, Córdoba y Nariño definidos como alta afectación.	Descontamina	CCCM	Finalizado	$ 257.491

DocuSign Envelope ID: 43863E5C-23B9-41F0-B844-F9C6A2A60673

Proyecto	Contraparte de Gobierno	Implementador	Estado	Monto Aprobado (con GMS)
Convocatoria Prevención - "Amigos por la Paz": Protección integral de niños, niñas y adolescentes en riesgo de ser reclutados por grupos armados ilegales en el marco del posconflicto armado colombiano	Consejería Presidencial para los DDHH	Aldeas Infantiles SOS	Finalizado	$ 1.137.008
Convocatoria Prevención - Procesos Articulados de Intervención: PAIS un entorno protector para niños, niñas y adolescentes hasta los 18	Consejería Presidencial para los DDHH	Círculo de Obreros de San Pedro Claver	Finalizado	$ 1.110.266
Convocatoria Prevención - Prevención de Reclutamiento, uso, y utilización de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados ilegales en el marco del Postconflicto	Consejería Presidencial para los DDHH	Fundación Plan	Finalizado	$ 1.092.063
Convocatoria Prevención - Prevención de Reclutamiento, uso, y utilización de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados ilegales en el marco del Postconflicto	Consejería Presidencial para los DDHH	Save the Children	Finalizado	$ 920.366
Plan para la coordinación nacional del proyecto de prevención del reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados ilegales	Consejería Presidencial para los DDHH	OIM/UNICEF	Finalizado	$ 515.013
Desarrollo de capacidades locales para la promoción y garantía del derecho a la salud con énfasis en salud sexual y reproductiva, salud mental, prevención del consumo de sustancias psicoactivas, atención a la infancia y salud nutricional en 14 departamentos y 25 municipios en los que se ubican 26 espacios territoriales de capacitación y reincorporación -ETCR (Antes 19 ZVTN Y 7 PTN).	Ministerio de Salud	OIM/UNFPA/OPS	Finalizado	$ 2.091.000
Mejoramiento del acceso con oportunidad y calidad a los servicios de agua, saneamiento e higiene de niñas, niños y adolescentes y población en general en las zonas de influencia de los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de Tumaco (Nariño) y Puerto Asís (Putumayo).	Viceministerio de Agua	UNICEF	Finalizado	$ 500.000
Prevención, protección y atención de mujeres y niñas víctimas de violencia en espacios públicos y privados en los municipios de los Departamentos de Nariño, Putumayo, Chocó y Norte de Santander, donde se ubican los 5 Espacios Territoriales de Capacitación y Reconciliación -ETCR-	Defensoria del Pueblo	PNUD, ONU MUJERES, ACNUR, UNICEF	Finalizado	$ 970.106

DocuSign Envelope ID: 43863E5C-23B9-41F0-B844-F9C6A2A60673

Proyecto	Contraparte de Gobierno	Implementador	Estado	Monto Aprobado (con GMS)
Programa de Construcción de Confianza y Paz Territorial en clave PDET para Chocó, Meta y Guaviare (7 municipios)	ART	PNUD, FAO, ACNUR, ONU MUJERES, UNICEF, PMA y Pastoral Social	Finalizado	$ 4.717.216
Convocatoria Desminado 2 - Acción contra las minas antipersional (MAP), municiones sin explotar (MUSE) y artefactos explosivos improvisados (AEI), para el municipio de San Vicente del Caguán del departamento del Caquetá	Descontamina	H&I	Finalizado	$ 566.500
Convocatoria Desminado 2 - Liberación de tierras dentro del proceso de construcción de paz en la zona 3 de la localidad 20 de Sumapaz - Bogotá Distrito Capital	Descontamina	ATEXX	Finalizado	$ 309.000
Convocatoria Desminado 2 - Fortalecimiento a las actividades de Desminado Humanitario en el municipio de Ipiales en el departamento de Nariño.	Descontamina	HALO TRUST	Finalizado	$ 515.000
Convocatoria Desminado 2 - Fortalecimiento a las actividades de Desminado Humanitario en el municipio de San Miguel en el departamento de Putumayo	Descontamina	HALO TRUST	Finalizado	$ 412.000
Convocatoria Desminado 2 - Actividades de Desminado Humanitario, ERM y Asistencia a Víctimas en Puerto Leguízamo y la zona 2 de Puerto Asís, Putumayo.	Descontamina	CCCM	Finalizado	$ 874.926
Convocatoria Desminado 2 - Desminado Humanitario en el municipio de Leiva (Nariño)	Descontamina	PERIGEO	Finalizado	$ 412.000
Gestión territorial para la accion contra minas antipersonales UNMAS	Descontamina	UNMAS	Finalizado	$ 500.000
Manos a la Obra para la Paz Fase II	ART	PNUD	Finalizado	$ 2.450.000
Convocatoria WPHF - Red de mujeres campesinas gestoras de la paz territorial del Nororiente colombiano	NA	Asociación Campesina del Valle del Río ACVC	Finalizado	$ 126.979
Convocatoria WPHF - Mujeres negras que desde la identidad se empoderan para la convivencia, la reconciliación y la protección territorial en la Costa Pacífica del Cauca	NA	Asociación JUNPRO	Finalizado	$ 127.193

DocuSign Envelope ID: 43863E5C-23B9-41F0-B844-F9C6A2A60673

Proyecto	Contraparte de Gobierno	Implementador	Estado	Monto Aprobado (con GMS)
Convocatoria WPHF - Participación e incidencia de las mujeres afrodescendientes de 5 municipios del Norte del Cauca para la implementación del acuerdo de paz y el ejercicio de sus derechos	NA	Asociación Municipal de Mujeres (ASOM)	Finalizado	$ 127.495
Convocatoria WPHF - PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES NARIÑENSES COMO PROTAGONISTAS DE LA DEMOCRACIA Y EL DESARROLLO EN EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE PAZ TERRITORIAL	NA	Corporación 8 de marzo. Mujeres y hombres por la igualdad	Finalizado	$ 127.437
Convocatoria WPHF - Mujeres indígenas protagonistas en procesos de construcción de paz	NA	Corporación de Apoyo a Comunidades Populares (CODACOP)	Finalizado	$ 118.536
Convocatoria WPHF - Organizaciones de Mujeres del Cauca protagonistas de la reconciliación para la convivencia pacífica y la planeación local en la construcción de paz territorial	NA	Corporación de Mujeres Ecofeministas (COMUNITAR)	Finalizado	$ 126.931
Convocatoria WPHF - Movilización social para la construcción y fortalecimiento de masculinidades no violentas y corresponsables en los municipios de Policarpa, El Rosario, Leiva y Cumbitara del Departamento de Nariño	NA	Corporación para el Desarrollo Social, Tecnológico y Económico de Colombia (CORPDESARROLLO)	Finalizado	$ 107.044
Convocatoria WPHF - Mujeres Anoriseñas organizadas, autoras de un desarrollo territorial sustentable que construye paz y equidad	NA	Corporación Vamos Mujer	Finalizado	$ 98.408
Convocatoria WPHF - Mujeres PRIS: entornos de Protección, acciones de Prevención, alerta y gestión de Riesgos de VBG, formación para la Incidencia sociopolítica y dinámicas de Sanación Colectiva	NA	Fundación Surcos de Vida ONG - Regional Nariño	Finalizado	$ 117.700
Convocatoria WPHF - Mujeres creando y transformando parala paz en Colombia	NA	Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad - LIMPAL	Finalizado	$ 123.050
Convocatoria WPHF - Mujeres mediadoras de conflictos y constructoras de paz	NA	Organización Femenina Popular (OFP)	Finalizado	$ 70.003

DocuSign Envelope ID: 43863E5C-23B9-41F0-B844-F9C6A2A60673

Proyecto	Contraparte de Gobierno	Implementador	Estado	Monto Aprobado (con GMS)
Convocatoria WPHF - Acciones de paz territorial con enfoque de género	NA	Red de Mujeres Chaparralunas por la Paz	Finalizado	$ 117.893
Convocatoria WPHF - Mujeres protagonistas en implementación territorial del Acuerdo de Paz	NA	Red Nacional de Mujeres	Finalizado	$ 125.552
Convocatoria WPHF - Convocatoria WPH - Construyendo paz territorial desde la actoría política de las mujeres	NA	RUTA PACÍFICA	Finalizado	$ 127.443
Convocatoria WPHF - REDMUNORCA	NA	REDMUNORCA	Finalizado	$ 107.000
Convocatoria WPHF - CENTRAP	NA	CENTRAP	Finalizado	$ 107.000
Enfoque de género en el servicio de la Policía	Policía Nacional	Alianza para la Paz	Finalizado	$ 1.618.262
Fortalecimiento del Sistema de Prevención y Alerta para la Reacción Rápida frente a organizaciones y conductas criminales que pongan en riesgo la implementación de los Acuerdos de Paz.	Defensoria del Pueblo	PNUD/ACNUR/ONU MUJERES	Finalizado	$ 1.795.376
Convocatoria PDET - CINCCO	ART	CINCCO	Finalizado	$ 76.189
Convocatoria PDET - Fund Reconciliación	ART	Fund Reconciliación	Finalizado	$ 67.976
Convocatoria PDET - CINDE	ART	CINDE	Finalizado	$ 102.146
Convocatoria PDET - ONIC	ART	ONIC	Finalizado	$ 103.000
Convocatoria PDET - Funda Fraternidad	ART	Funda Fraternidad	Finalizado	$ 102.730
Convocatoria PDET - IMP	ART	IMP	Finalizado	$ 103.000
Convocatoria PDET - ANZORC	ART	ANZORC	Finalizado	$ 103.000
Convocatoria PDET - Red Mujeres Chaparralunas	ART	Red Mujeres Chaparralunas	Finalizado	$ 102.989
Convocatoria PDET - Concern Universal	ART	Concern Universal	Finalizado	$ 102.973
Convocatoria PDET - ASOPEP	ART	ASOPEP	Finalizado	$ 99.550
Convocatoria PDET - Tiempo de Mujeres	ART	Tiempo de Mujeres	Finalizado	$ 100.468
Convocatoria PDET - Red Cantoyaco	ART	Red Cantoyaco	Finalizado	$ 89.328
Convocatoria PDET - Proyectamos Colombia	ART	Proyectamos	Finalizado	$ 102.834

DocuSign Envelope ID: 43863E5C-23B9-41F0-B844-F9C6A2A60673

Proyecto	Contraparte de Gobierno	Implementador	Estado	Monto Aprobado (con GMS)
		Colombia		
Convocatoria PDET - Contravía	ART	Contravía	Finalizado	$ 92.700
Convocatoria PDET - CODHES	ART	CODHES	Finalizado	$ 97.100
Convocatoria PDET - Universidad de Ibagué	ART	Universidad de Ibagué	Finalizado	$ 103.000
Desarrollo de capacidades locales para el fortalecimiento de la atención primaria en salud – Fase II	Ministerio de Salud	OIM/UNFPA/OPS	Finalizado	$ 1.835.869
Convocatoria Desminado 3 - Despeje de áreas contaminadas por artefactos explosivos en Puerto Leguizamo y la zona 2 de Puerto Asís, Putumayo	Descontamina	CCCM	En Implementación	$ 598.179
Convocatoria Desminado 3 - Desminado Humanitaro sostenible en San Vicente del Caguán (Zona 1) Caquetá	Descontamina	H&I	En Implementación	$ 461.879
Convocatoria Desminado 3 - Sostenibilidad de las actividades de desminado humanitario en el municipio de Ipiales (zona 2), departamento de Nariño y en el municipio de San Miguel (Zona 1), departamento de Putumayo	Descontamina	HALO TRUST	En Implementación	$ 158.555

Ámbito 2: Justicia transicional y reconciliación (Resultado 4)

Proyecto	Contraparte de Gobierno	Implementador	Estado	Monto Aprobado (con GMS)
Apoyo a la salida de los niños, niñas y adolescentes de los campamentos de las FARC-EP	Consejería Presidencial para los DDHH	OIM/UNICEF	Finalizado	$ 355.725
Apoyo al Programa de Reparación Colectiva en Colombia para la generación de confianza, la construcción de paz territorial y el fortalecimiento del Estado de Derecho en el posconflicto	UARIV	FAO/PNUD/ONU MUJERES	Finalizado	$ 3.000.000
Actos tempranos de reconocimiento de responsabilidad colectiva	NA	Fundación el Arte de vivir	Finalizado	$ 22.822

DocuSign Envelope ID: 43863E5C-23B9-41F0-B844-F9C6A2A60673

Proyecto	Contraparte de Gobierno	Implementador	Estado	Monto Aprobado (con GMS)
Focalización de cupos de indemnización en zonas estratégicas de Respuesta Rápida	UARIV	OIM/UNFPA	Finalizado	$ 4.346.571
Apoyo a la Jurisdicción Especial para la Paz - JEP (en el marco del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición), a través de la puesta en marcha de su Secretaría Ejecutiva (SE).	JEP	OIM/PNUD	Finalizado	$ 4.717.416
Contribuir a la garantía de la verdad y la reparación, asegurando la participación informada y decisoria de los familiares- víctimas, en los procesos institucionales de búsqueda, exhumación, identificación, entrega digna e inhumación final, de las víctimas mortales en los hechos ocurridos el 2 de mayo de 2002 en Bellavista – Bojayá	Instituto de Medicia Legal Consejería Presidencial para los DDHH	PNUD y ONU Derechos Humanos	Finalizado	$ 766.141
Fortalecimiento de las organizaciones sociales para contribuir en la búsqueda, localización, identificación, entrega digna y medidas de satisfacción para las víctimas de desaparición forzada	Consejería Presidencial para los DDHH	PNUD	Finalizado	$ 370.000
Apoyo al Comité de Escogencia de integrantes de los componentes del sistema integral de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición	NA	PNUD y contrapartida de ONU Mujeres	Finalizado	$ 677.758
Apoyo a la salida de los niños, niñas y adolescentes de los campamentos de las FARC-EP II	Consejería Presidencial para los DDHH	OIM y UNICEF	Finalizado	$ 1.000.000
Apoyo al proceso de alistamiento de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (CEV)	Comisión de la Verdad	PNUD - ONU Derechos Humanos	Finalizado	$ 2.825.954
Contribuir al proceso creación y de alistamiento adecuado y oportuno de la UBPD en relación con las acciones humanitarias de búsqueda, localización, identificación y entrega digna de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto	UBPD	PNUD/ONU DDHH/UNICEF	Finalizado	$ 2.239.777

DocuSign Envelope ID: 43863E5C-23B9-41F0-B844-F9C6A2A60673

Proyecto	Contraparte de Gobierno	Implementador	Estado	Monto Aprobado (con GMS)
Garantía de la representación de las víctimas a través del fortalecimiento de las capacidades de la Procuraduría General de la Nación (PGN) para contribuir a los procesos de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.	Procuraduría General de la Nación	OIM	Finalizado	$ 780.089
Convocatoria Victimas - Corp Viva la Ciudadanía	CEV	Corp Viva la Ciudadanía	Finalizado	$ 154.431
Convocatoria Victimas - ACIN	CEV	ACIN	Finalizado	$ 153.715
Convocatoria Victimas - Corporación Región	CEV	Corporación Región	Finalizado	$ 154.479
Convocatoria Victimas - ASOM	CEV	ASOM	Finalizado	$ 142.922
Convocatoria Victimas - Pastoral Suroriente	CEV	Pastoral Suroriente	Finalizado	$ 148.225
Convocatoria Victimas - Fundación para la Libertad de Prensa	CEV	Fundación para la Libertad de Prensa	Finalizado	$ 84.428
Convocatoria Victimas - Escuela Nacional Sindical	CEV	Escuela Nacional Sindical	Finalizado	$ 142.887
Convocatoria Victimas - MOVICE	CEV	MOVICE	Finalizado	$ 154.260
Convocatoria Victimas - CCAJAR	CEV	CCAJAR	Finalizado	$ 154.500
Convocatoria Victimas - Fundacion Franciscana	CEV	Fundacion Franciscana	Finalizado	$ 146.794
Convocatoria Victimas - CREDHOS	JEP	CREDHOS	Finalizado	$ 152.786
Convocatoria Victimas - HUMANAS	JEP	HUMANAS	Finalizado	$ 122.291
Convocatoria Victimas - ASCOLEMAD	JEP	ASCOLEMAD	Finalizado	$ 152.779
Convocatoria Victimas - CITPAX	JEP	CITPAX	Finalizado	$ 184.667
Convocatoria Victimas - Corporación Yira Castro	JEP	Corporación Yira Castro	Finalizado	$ 154.500
Convocatoria Victimas - FUNDECOS	UBPD	FUNDECOS	Finalizado	$ 154.500
Convocatoria Victimas - Colectivo OFB	UBPD	Colectivo OFB	Finalizado	$ 142.655

DocuSign Envelope ID: 43863E5C-23B9-41F0-B844-F9C6A2A60673

Proyecto	Contraparte de Gobierno	Implementador	Estado	Monto Aprobado (con GMS)
Convocatoria Victimas - Corp Desarrollo y paz Magdalena Medio	UBPD	Corp Desarrollo y paz Magdalena Medio	Finalizado	$ 129.656
Convocatoria Victimas - Fundacion Progresar Nte Stder	UBPD	Fundacion Progresar Nte Stder	Finalizado	$ 153.744

Ámbito 1: Justicia y Seguridad (resultado 1)

Proyecto	Contraparte de Gobierno	Implementador	Estado	Monto Aprobado (con GMS)
Fortalecimiento de la CSIVI, el CNR y la agrupación de voceros de paz para la efectiva implementación del acuerdo final, con énfasis en los puntos 2,3,y 6	NA	Centro Pensamiento	Finalizado	$ 2.175.081
Reincorporación de excombatientes a través del desminado humanitario para la territorial. HUMANICEMOS	Descontamina	UNMAS - UNOPS	Finalizado	$ 4.295.852
Reincorporación integral en entornos productivos con enfoque comunitario	ARN	OIM y PNUD	En Implementación	$ 5.000.000
Integración Socioeconómica, comunidad y construcción de paz territorial	ARN	FAO	En Implementación	$ 1.706.660
Mejoramiento de las capacidades técnicas, metodológicas y operativas del acompañamiento a la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la implamentación del Acuerdo Final (CSIVI), para la cualificación del desempeño de sus funciones y como parte del proceso de reincorporación integral.	NA	Centro de Pensamiento y Diálogo Político (CEDIPO)	Finalizado	$ 717.756

Ámbito 5: Información, comunicación y relacionamiento (resultado 8)

Proyecto	Contraparte de Gobierno	Implementador	Estado	Monto Aprobado (con GMS)
Fortalecimiento de la Estrategia de Pedagogía de los Acuerdos de Paz de la Oficina del Alto Comisionado para la paz	OACP	PNUD	Finalizado	$ 1.228.270

DocuSign Envelope ID: 43863E5C-23B9-41F0-B844-F9C6A2A60673

Convocatoria pedagogía - Atratiando por la paz, una opción por la vida	NA	COCOMACIA	Finalizado	$ 78.896
Convocatoria pedagogía - Estrategia de BTL (comunicación y difusión pedagogíca) de los acuerdos de la Habana entre la población LGBT para su movilización como agentes de cambio en la finalización del conflicto, la implementación de los acuerdos y la construcción de paz en Colombia.	NA	COLOMBIA DIVERSA	Finalizado	$ 60.918
Convocatoria pedagogía - Campaña para la activación de los jóvenes en la refrendación de los acuerdosel Acuerdo Final de paz y su implementación	NA	PACIFISTA	Finalizado	$ 154.500
Convocatoria pedagogía - Todos somos paz	NA	FUNDEXCO	Finalizado	$ 154.500
Convocatoria pedagogía -Pedagogía para la divulgación, comprensión, movilización e implementación del Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera en Colombia desde la perspectiva de las mujeres.	NA	SISMA MUJER	Finalizado	$ 154.500
Convocatoria pedagogía - Común Acuerdo: Conversaciones ciudadanas para la comprensión de los Acuerdos de Paz.	NA	VIVA LA CIUDADANÍA	Finalizado	$ 154.500
Convocatoria pedagogía - Las Mujeres Pazharemos construyendo la paz – Pedagogía de Acuerdo de Paz en 9 regiones de Colombia	NA	RUTA PACÍFICA	Finalizado	$ 150.089
Convocatoria pedagogía - Estrategia nacional para el fortalecimiento de la participación de las mujeres como sujetos políticos en la implementación del Acuerdo final para la terminación de conflicto y la construcción de una paz estable y duradera.	NA	CASA MUJER	Finalizado	$ 154.500
Convocaoria pedagogía - Hacia los retos, oportunidades y expectativas de la implementación del Acuerdo final en las Zonas de Reserva Campesina	NA	ANZORC	Finalizado	$ 148.134
Iniciativa Barómetro: Estrategia de seguimiento y asistencia técnica al proceso de implementación de los acuerdos de paz en Colombia".	NA	Pastoral Social/Kroc	Finalizado	$ 1.027.866
Secretaría Técnica de los Notables del Componente Internacional de Verificación del Acuerdo Final de Paz	NA	Cinep / Cerac	Finalizado	$ 617.975
Fortalecimiento a la Instancia Especial de Mujeres para la implementación del enfoque de género en el Acuerdo Final	Instancia Especial de Mujeres	ONU MUJERES	En Implementación	$ 501.920

DocuSign Envelope ID: 43863E5C-23B9-41F0-B844-F9C6A2A60673

Anexo No. 3. Contexto

El siguiente análisis describe brevemente las casuas del conflicto colombiano, consideradas en el desarrollo del Acuerdo Final de Paz. Cabe destacar que los factores se relacionan no en causalidad, si no en interdependencia:

Según el Instituto Agustín Codazzi, en un estudio sobre tenencia de la tierra en el país realizado en el año 2017, aplicando el índice Gini, el índice de desigualdad es del 89,7% y el 64% de la población rural no tiene acceso a tierras. Este factor aunado a la pobreza que atraviesan las zonas rurales dispersas – 47,5% pobreza monetaria para el año 2019, más de 10 puntos por encima de la pobreza monetaria registrada en las cabeceras- ha sido considerado tradicionalmente como unas de las principales casuas del conflicto interno.

Sin embargo, cabe mencionar que esta **distribución desigual de la tierra** tiene su origen en unas estructuras de poder que favorecen las relaciones políticas de patronazgo y caudillismo, por encima de las relaciones democráticas, que tienen sus orígenes en los conflictos aún sin resolver de la colonia. La falta de una distribución equitativa de la tierra, la incertidumbre respecto de la tenencia y la sub-utilización del suelo, generan desigualdad y pobreza, y por lo tanto una inconformidad por parte de los campesinos que no tienen acceso a los derechos más básicos.

La pobreza refleja la **falta de goce efectivo de derechos de la población** y una afectación a su desarrollo humano al no poder ampliar sus opciones de bienestar. Estas brechas de acceso aumentan en poblaciones especialmente vulnerables como las mujeres, los campesinos, las comunidades étnicas o la comunidad LGBTI. Esta falta de acceso procura que las comunidades se integren a las dinámicas de las economías ilegales o la delincuencia, exacerbando el círculo de pobreza y violencia.

Para 2018, el Índice de pobreza Multidimensional del país fue del 19,6%, y el de Necesidades Básicas Insatisfechas de 14,3%, estos datos denotan que aún es evidente la exclusión de una inmensa porción de la población de los beneficios que la democracia establece como básicos para el desarrollo de una sociedad. La concentración del capital y el abandono estatal han favorecido esta exclusión sistemática que ha derivado en inconformidad social, falta de confianza en las instituciones y ruptura del tejido social.

DocuSign Envelope ID: 43863E5C-23B9-41F0-B844-F9C6A2A60673

El conflicto por el control territorial de grupos armados ilegales y la tenencia de los recursos naturales de extracción legal e ilegal ha contribuido al desarrollo de dinámicas de despojo y desplazamiento, que se han apoyado en la **debilidad institucional** para controlar el territorio y satisfacer las necesidades de la población.

Es clara la interrelación entre la violencia y mercados como el de la cocaína o la minería ilegal, que se convierten en una fuente de financiamiento de estructuras criminales, que se aprovechan de comunidades sin oportunidades, para establecer gobiernos alternos en los que impera el control coercitivo y la violencia. Cabe destacar que a su vez estas economías generan una serie de afectaciones a las dinámicas democráticas.

La falta de garantías a la participación política degenera en una deficiente legitimidad de la democracia, y en la desconfianza de la población en las instituciones y en su intervención en la resolución de conflictividades. El surgimiento de poderes alternos que validan la **resolución violenta de conflictos** representa una ruptura del tejido social y una falta de confianza generalizada que evita incluso, que la sociedad civil accione para buscar incidir políticamente o cooperar para la transformación de sus territorios.

Bibliografía:

- Yaffe, Lilian.*Conflicto armado en Colombia: análisis de las causas económicas, sociales e institucionales de la oposición violenta.* Revista CS, núm. 8, julio-diciembre, 2011, pp. 187-208Universidad ICESI. Cali, Colombia.
- Universidad del Rosario, *Tierra y Violencia*, Universidad, Ciencia y Desarrollo, Tomo IV.
- Giraldo, Lina. *La concentración de la tierra y la violencia en colombia: factores desencadenantes de la resistencia armada a mediados del siglo xx.* Universidad Pedagógica Nacional Facultad de Humanidades Departamento de Ciencias Sociales. Bogotá.
- Perea, Carlos Mario (2016). Vislumbrar la paz. Violencia, poder y tejido social en ciudades latinoamericanas. Editorial Debate.
- Eduardo Pizarro Leongómez, *Una democracia asediada. Balance y perspectivas del conflicto armado en Colombia*, Bogotá, Grupo Editorial Norma, 2004.

DocuSign Envelope ID: 43863E5C-23B9-41F0-B844-F9C6A2A60673

DocuSign Envelope ID: 43863E5C-23B9-41F0-B844-F9C6A2A60673
